

Licenciado  
Juan Alberto Monzón Esquivel  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2016, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 24-2016, correspondiente al mes de **julio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000074**.

**Actividades Realizadas:**

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio 137 en el sitio arqueológico Yaxha.
4. Supervisión en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio A-3 en el sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo.

### Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en el sitio arqueológico Naraijo; donde se repararon 20 m<sup>2</sup> de techo de lámina en el de dormitorios del personal operativo.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 12 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naraijo.
3. Se supervisó los trabajos de restauración del edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las siguientes actividades:


- Estabilización de 8 m<sup>2</sup> de talud y relleno constructivo en el segundo cuerpo de la fachada oeste al norte de la escalinata central, en donde se desmontó el muro en la esquina por encontrarse dañada por una grieta, se estabilizó el núcleo y se armó nuevamente la esquina.



- Estabilización de 12 m<sup>2</sup> del núcleo constructivo en el cuarto cuerpo en la fachada este.



- Se recuperó 12 m<sup>2</sup> de muro en la el cuarto cuerpo en la fachada norte, trabajo realizado con piedra laja y mezcla hecha a base de cal.

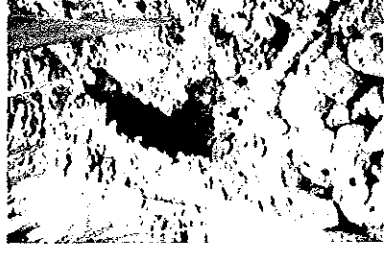


4. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-24 en donde se realizaron las siguientes actividades:

- Remoción de material orgánico, tierra y piedra suelta la fachada sur del cuerpo que sustenta los mascarones, actividad previa a iniciar con los trabajos de estabilización y recuperación de volumen, se trabajó una superficie equivalente a los 48 m<sup>2</sup>.



- Se construyó una torre de andamios en la esquina sureste, con la finalidad de facilitar el abastecimiento de materias que se utilizan en los trabajos de restauración.

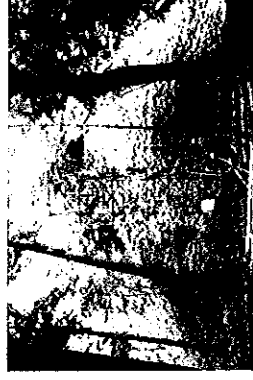


- Se estabilizo 10 m<sup>2</sup> de muro del área liberada en la fachada sur del cuerpo que sustenta los relieves.

- 5. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio A-3 en la Acrópolis Oeste del sitio arqueológico Naranjo en donde se trabajó en la estabilización del relieve liberado por uno de los practicantes de arqueología en la fachada oeste del edificio, en total se restauró 4 m<sup>2</sup> de fachada.

- 6. Se supervisaron los trabajos de restauración en el edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo en donde se restauraron 26 m<sup>2</sup> entre escalinatas y cuerpos liberados en la fachada este.



Raúl Eduardo Noriega Girón



Edin Ravel Hernández Pajés  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEH/INPCN

C.c. Administración DECORSIAP. Archivo.
