

Arquitecto.
Breitner Roely Gonzales Maldonado
Director General
Dirección General del patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Director;


De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato de Prestación por servicios Técnicos Número DGPCYN-029-1471-2021**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 291 -2021** correspondiente **al mes de mayo del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la Serie: ABE338D5 Número de DTE: 1682590012

Actividades Realizadas:

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio B-17 en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Apoyo en la restauración del edificio 375 en el sitio arqueológico Yaxha.
6. Apoyo en el mantenimiento de infraestructura en el campamento de Yaxha.

Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo.
2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 10 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, generando vistas de edificios con arquitectura restaurada dentro del conjunto urbano.

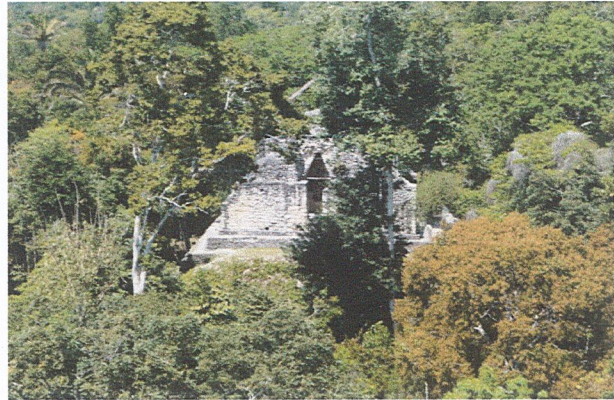

Edificio B-18, vista generada desde el edificio B-24

3. En el edificio B-24 esquina noroeste, se trabajó en la estabilización del talud en el antepenúltimo cuerpo, en la esquina se registró la formación de grieta, para lo que fue necesario remover material suelto y reponerlo nuevamente utilizando piedra unida con mezcla hecha a base de cal, se trabajó 10 m² de muro.



Edificio B-24, proceso de remoción de material suelto en esquina noroeste.

4. En el edificio B-17 del sitio arqueológico Naranjo se trabajó en la restauración de la fachada oeste en la definición de vanos sobre la escalinata y el muro al norte. Se trabajó 20 m² de muro y se estabilizó parte del núcleo de los muros y los sillares tallados que se conservan en su posición original.

Edificio B-17, proceso de restauración de arquitectura expuesta



5. En el edificio 375 del sitio arqueológico Yaxha se trabajó en la impermeabilización del techo en el extremo este para lo que fue necesario construir una torre de andamios y el desmontaje del relleno sobre las piedras de bóveda, se trajo 10 metros cuadrados de muro.



Edificio 375, fachada sur

6. En el campamento de Yaxha se completó el remozamiento de uno de los dormitorios que usa el personal técnico durante su permanencia en el campo, para lo que se usó en el techo lámina de zinc y las paredes se hicieron con piedra y mezcla hecha a base de cal.



Proceso de rehabilitación de dormitorios, muros de piedra y mezcla hecha a base de cal.

Raúl Eduardo Noriega Girón

Vo. Bo.

Mariela López
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEN-DGPCYN

C,c. Archivo.
