

Guatemala, 28 de febrero de 2023

Licenciada
Aura Marina Gómez Mazate
Jefe de Departamento Sustantivo II en Funciones
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Licenciada Aura Marina Gómez:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el acta No. CCMAA-DGA-002-2023.

Actividades realizadas:

- a. Se apoyó en los trabajos de limpieza del segmento que se les fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- b. Se apoyó en los trabajos de desinfección del segmento que se les fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- c. Se apoyó en los trabajos de liberación de agregados del segmento que se le fue asignado para el proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
- d. Otras actividades afines a su contrato.

Resultados Obtenidos:

- En los días del 01 al 10 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de limpieza del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
 - Como parte de dichos trabajos se utilizó herramientas de limpieza como cepillos metálicos para la remoción primaria superficial de elementos contaminantes, en la que se eliminaron partículas de polvo, residuos orgánicos e inorgánicos que puedan estar impregnados en la superficie.

- En los días del 13 al 17 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de desinfección del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
 - Para poder realizar dichos trabajos se utilizó aspersores, brochas, cepillos con cerdas de plástico y cepillos con cerdas metálicas para hacer un tallado a profundidad, además de material químico diluido, tales como anti sarro, ácido muriático y ácido oxálico para eliminar todo el material orgánico e inorgánico que se ha impregnado en las superficies de manera profunda y las cuales se desinfectaron. Para realizar dicho trabajo se dio uso al equipo de seguridad industrial implementado para dichas labores, dentro del cual se encuentran gafas protectoras, casco, respirador con filtro, guante para manejo de químicos, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida.
- En los días del 20 al 28 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de liberación de agregados del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
 - Para esta fase se utilizaron cinceles, martillos y pulidoras para lograr retirar los materiales de acabados como teselas dañadas, cernido, repello y mortero de pega utilizado para la adherencia de las mismas. Dentro del equipo de seguridad industrial se utilizó guantes protectores, gafas protectoras, casco, mascarillas o respirador, chalecos de alta visibilidad, arneses y líneas de vida.



Daniel Antonio Ixjotop Culajay

Vo. Bo



Licda. Aura Marina Gómez Mazate
Jefe de Departamento Sustantivo II en Funciones
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL ÚNICO
PRODUCTO
PRODUCTO DEL AÑO 2023**


Dependencia: Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias
Producto a Entregar: Único producto

Nombre: Daniel Antonio Ixjotop Culajay

		PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023																		
		FEBRERO																		
ACTIVIDADES	01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28
En los días del 01 al 10 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de limpieza del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.	X	X	X	X	X	X	X	X												
En los días del 13 al 17 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de desinfección del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.									X	X	X	X	X							
En los días del 20 al 28 de febrero se iniciaron a realizar los trabajos de liberación de agregados del segmento A1 de la fachada oriente del proyecto de revitalización, remozamiento y restauración de las fachadas oriente y poniente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.														X	X	X	X	X	X	X



Daniel Antonio Ixjotop Culajay

Vo. Bo




Lidia Aura Marina Gómez Mazate
Jefe de Departamento Sustantivo II en Funciones
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

ANEXO

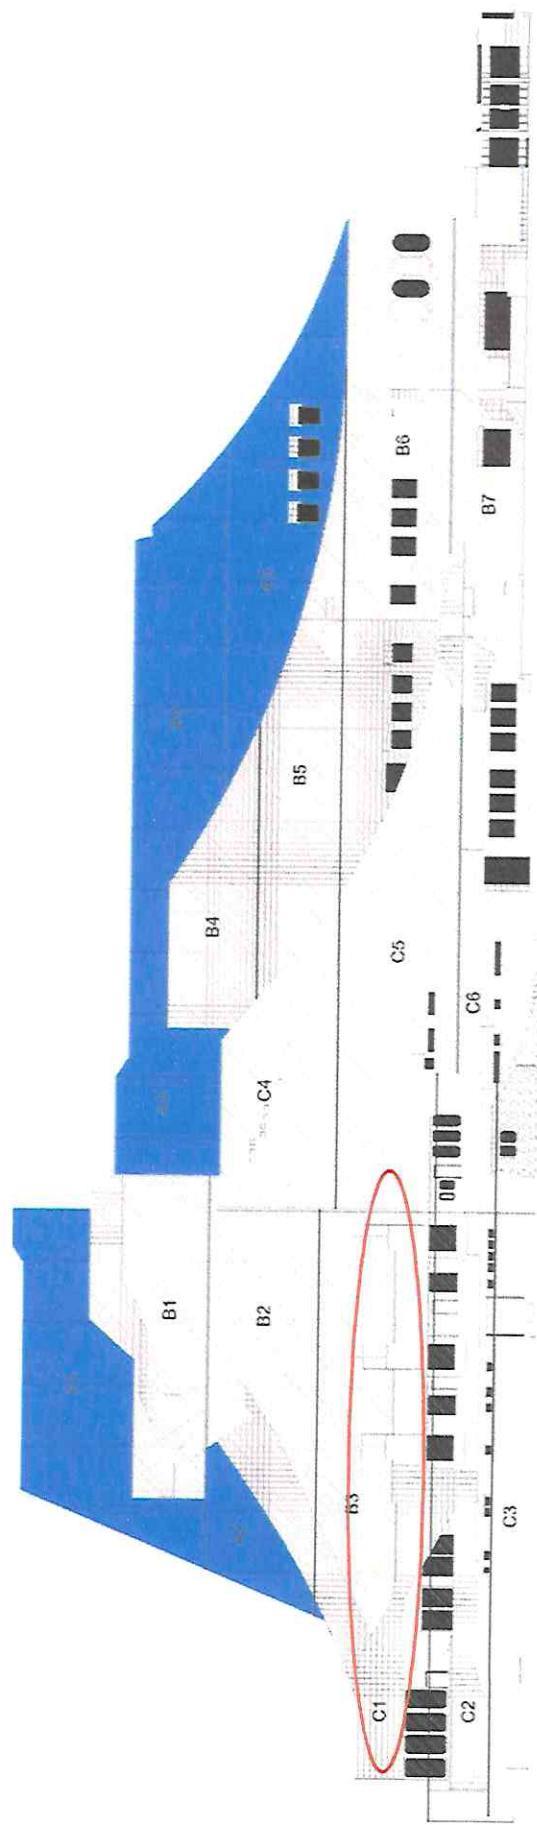


Esquema de ubicación de sectores de la fachada oriente. En el lado inferior izquierdo en un círculo rojo se ubica el sector C1.

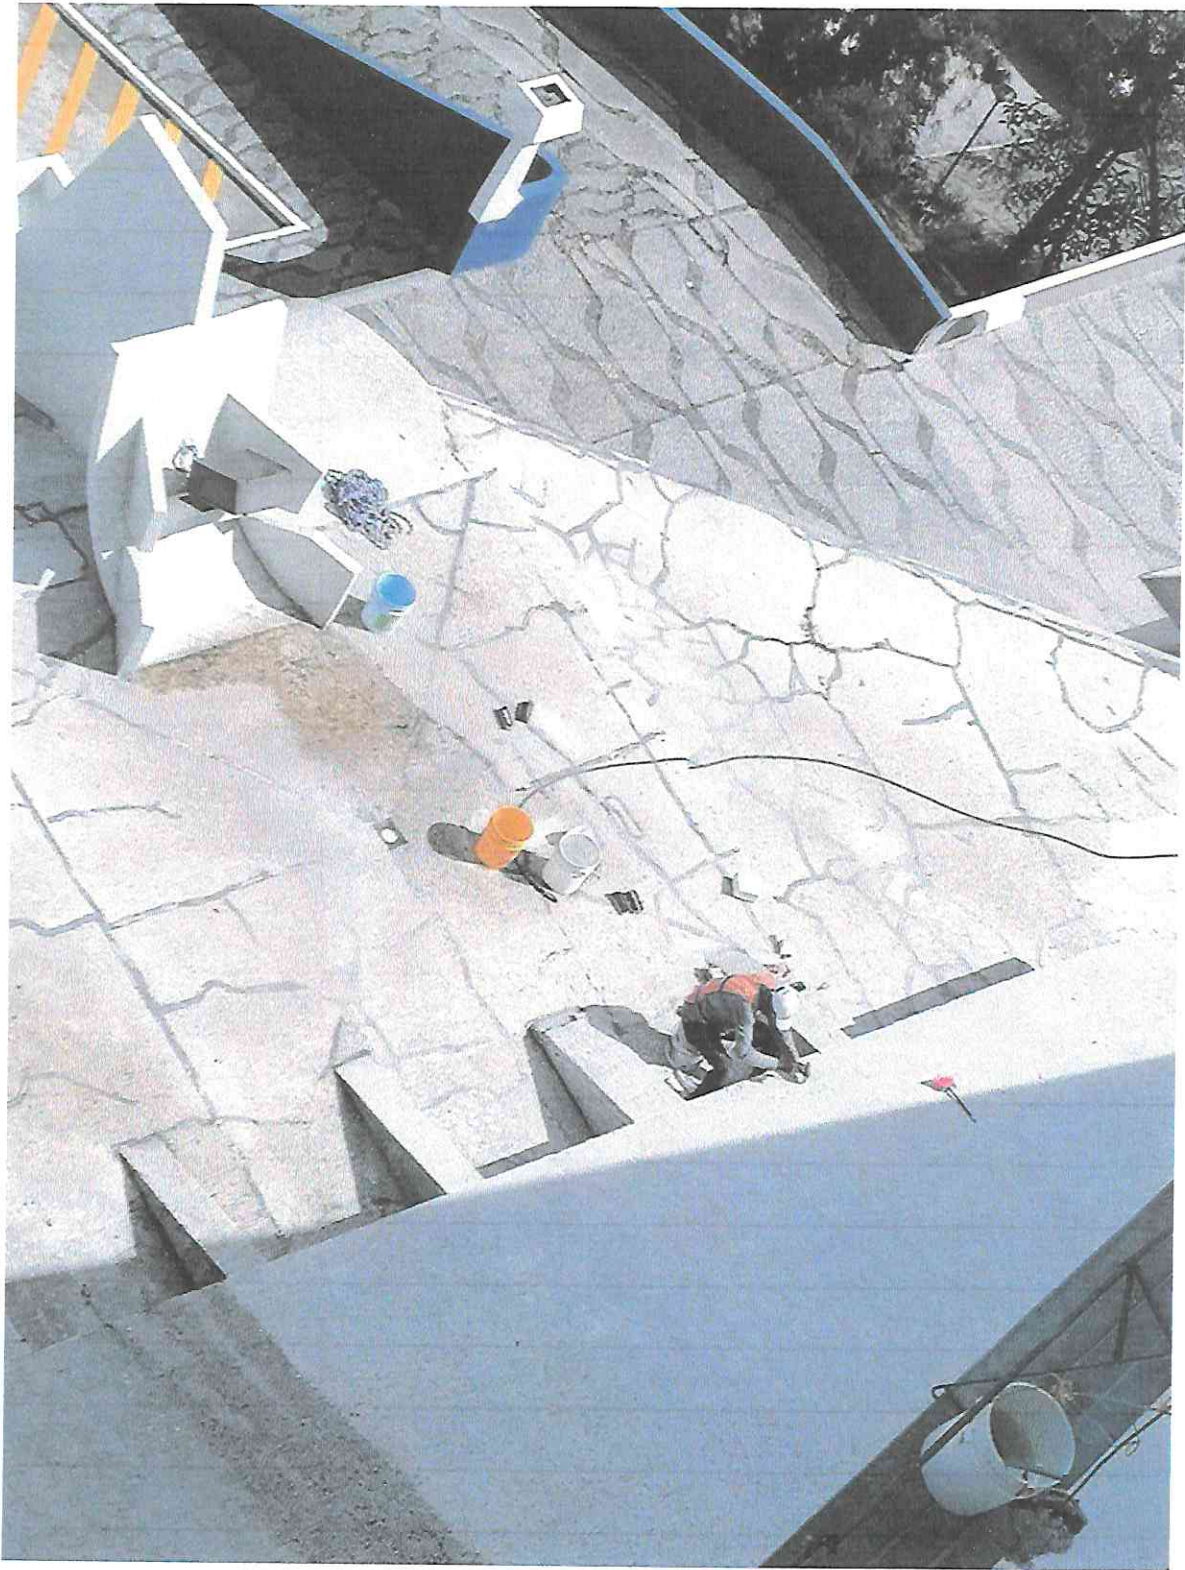

Desinfección de tesela en el techo del sector C1.



Liberación de agregados en lámparas del sector C1.

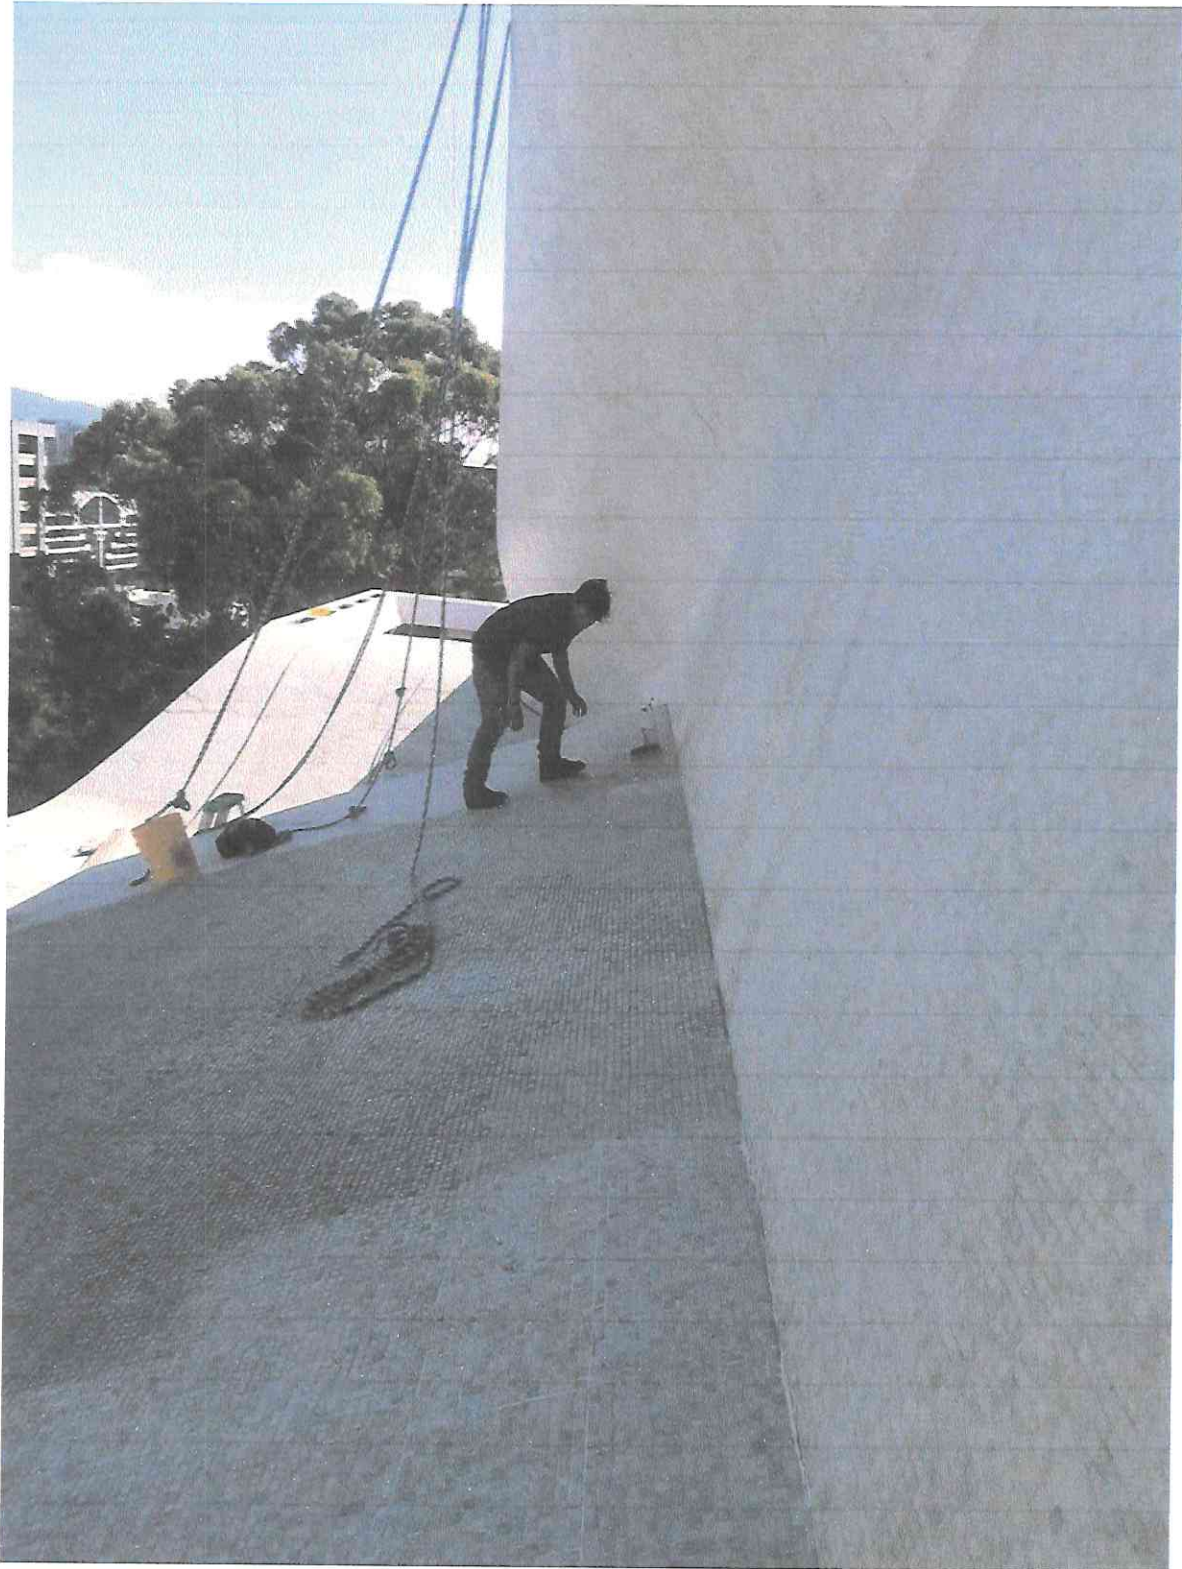

Limpeza de tesela en el sector C1.

Licda. Aura Marina Gómez Mazate
Jefe de Departamento Sustantivo II en Funciones
Centro Cultural Miguel Angel Asturias
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
