

Guatemala, 31 de Marzo 2014.
Informe 03-2014

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 197-2014**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **27-2014**, correspondiente al **mes de marzo del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000034**.

Actividades Realizadas:


1. Supervisión de la construcción del dormitorio para el personal operativo en el campamento del IDAEH en el sitio arqueológico Yaxha.
2. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
4. Supervisión en la restauración en el edificio A-5 de naranjo.

Actividades emergentes.

5. Supervisión en la restauración del edificio B-18 de Naranjo.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos en el reacondicionamiento en los dormitorios para personal operativo ubicados en el área de uso público en el campamento del sitio arqueológica yaxha., en donde se concluyó con el levantado de la construcción del dormitorio que ocupa un área de 12.00 m X 7.50 m. el techo se hizo con palma de guano mientras que las paredes están hechas con bajareque.

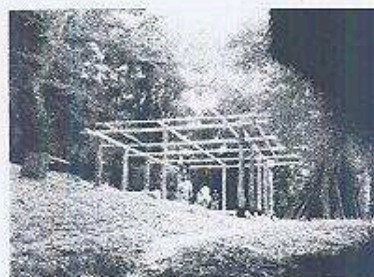

Proceso del trabajo en los dormitorios

2. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento de Naranjo, además se supervisó el trabajo hecho en las nuevas letrinas para el personal operativo, la cual cubre un área de 4.00 m. X 6.00 m.

3. Se mantuvo una actividad constante de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 8 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.



Trabajos de control de vegetación en la fachada norte de la acrópolis central

4. Se supervisó los trabajos de restauración en la fachada norte del edificio A-5, en donde se estabilizó y consolidó 26 m² de su fachada.




Fachada norte trabajos de restauración en proceso

Actividades emergentes

5. Se superviso los trabajos de conservación en el edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo, iniciando con la documentación y el relleno del túnel hecho por depredadores hace más de 10 años ubicado aproximadamente a media altura de la escalinata oeste en el eje del edificio,, se rellenó 10 metros de túnel aproximadamente.,
6. Se elabora registro de daños y propuesta preliminar de intervención para la estabilización del edificio 137 en Yaxha.


~~Coordinaor Administrativo~~
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
DAEH-DOPCH


Raúl Eduardo Noriega Girón
