

Guatemala, 29 de mayo 2015.  
Informe 05-2015

Arquitecto  
Juan Pablo Rosales Tinoco  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimada Arquitecto.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 8-2015**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **16-2015**, correspondiente al mes de **mayo del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000057**.

**Actividades Realizadas:**

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio B-18 del sitio arqueológico Naranjo.
4. Supervisión en la restauración del edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo.
6. Supervisión en la restauración del edificio 137 del sitio arqueológico Yaxha.
7. Supervisión en la producción de cal en el sitio arqueológico Naranjo y Yaxha.


## Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó los trabajos de limpieza general en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en Naranjo, cuya área es la equivalente a 1 Ha.
2. Se supervisaron los trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 4 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, concentrándose el trabajo la parte este la ciudad.


3. Se supervisó los trabajos realizados en el lado oeste del edificio B-18, en donde se realizan actividades de restauración en los laterales de las gradas, trabajando el último cuerpo de la pirámide recuperando parte de su volumetría consolidando el material de relleno y lo que se conserva de la piedra de fachada. Se estabilizó 10 m<sup>2</sup> de los cuerpos.



4. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio A-3 del sitio arqueológico Naranjo, en donde la actividad de restauración se realiza en el muro norte en donde se está desmontando piedra de fachada que da forma a la decoración de la fachada y se sustituye por piedra nueva pues la original se encuentra totalmente deteriorada, por la complejidad del trabajo el área trabajada es de 5 m<sup>2</sup>.

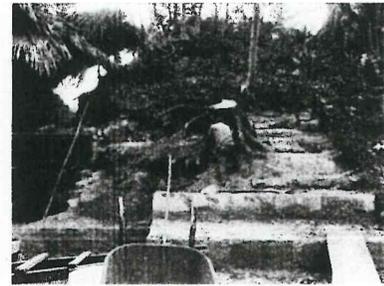


5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio B-24 del sitio arqueológico Naranjo, en donde se trabaja en la estabilización del talud en la mitad sur del cuerpo sobre el que se apoya el mascarón en la fachada oeste, el trabajo consiste esencialmente en la remoción de la piedra y relleno suelto recuperando nuevamente su volumen utilizando piedra y mezcla hecha a base de cal, se estima que se trabajó 28 m<sup>2</sup> de muro.

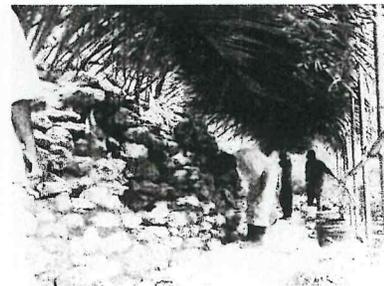

6. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio 137 en la Acrópolis Norte de Yaxha, en donde se realizaron las actividades siguientes: traslado de piedra laja recolectada en la periferia del área arqueológica al punto de trabajo; remoción de relleno suelto en el núcleo de la plataforma del segundo cuerpo en la fachada norte; recuperación del volumen removido utilizando piedra y mezcla hecha a base de cal, se recuperó aproximadamente 18 m<sup>3</sup> de volumen.



7. Se supervisó el proceso de quema de piedra para la producción de cal en pasta utilizada en los diferentes trabajos de restauración que se realizan en Naranjo de donde se obtuvo el equivalente a 46 toneles de cal en pasta. Actividad similar se realizó en Yaxha con una producción equivalente a los 39 toneles de cal en pasta.

  
~~Edin Rafael Hernández Paye~~  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEH-DGPCN

  
Raúl Eduardo Noriega Girón
