



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**



**COPIA**

Guatemala, 5 de noviembre de 2025  
Oficio No. **DIPLAMI-864-2025/MAMC/ keoc**

Licenciada

**Lucrecia Edith Martínez López**  
**Directora Técnica de Presupuesto -DTP-**  
Ministerio de Finanzas Públicas



**Señora Directora:**

Nimalaj rutzil wach alaq, kinwiye'j utzilal xuquje' tewchinik pa taq ri chak ronojel q'ij. (K'iche'). Es un placer dirigirme a usted con un saludo cordial, deseándole éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

En cumplimiento al artículo 81. Ejecución física de inversión del Decreto 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado" vigente para el Ejercicio Fiscal 2025, para lo cual se remite la Ejecución física de inversión del Ministerio de Cultura y Deportes correspondiente al mes de **octubre** 2025.

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente,

**Licda. Mariela Alejandra Morataya Contreras**  
Directora de Planificación y  
Modernización Institucional  
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Lic. Carlos Mendoza Alvarado, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-  
Se adjuntan: 44 folios inclusive  
Archivo **DIPLAMI**



Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

Guatemala, 04 de noviembre de 2025  
**OFICIO DPM/DGDR-447-2025**

**Licenciada**

**Mariela Alejandra Morataya**

**Directora de Planificación y Modernización Institucional**

**Ministerio de Cultura y Deportes**

**Su Despacho**

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL



**Licenciada Morataya:**

HORA: 10:48 RESPONSABLE: [Signature]

De manera atenta, me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

Por este medio se traslada el **OFICIO DIF-YGG-6965-2025/jtm**, en seguimiento al **Conocimiento DIF-PLANI-6962-2025/wn**, en relación al cumplimiento del comprobante de Ejecución de Metas de los Proyectos en Ejecución y el **OFICIO DIF-YGG-6951-2025/jtm** donde remiten el informe mensual de Avances y Logros, correspondiente al mes de octubre 2025, de la Dirección de Infraestructura Física.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

*Sofia Annajael Diaz Alecio*  
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Archivo





**Señora**  
**Sofía Annajael Díaz Aleció**  
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Ministerio Cultura y Deportes  
Presente



Estimada Señora Díaz:

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **OFICIO DIF-PLANI-6962-2025/mr**, de fecha 31 de octubre de 2025, emitido por el Departamento de Planificación de Proyectos, quien remite comprobante de ejecución de metas del mes de octubre del presente año de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.

Así mismo, informa que mediante **OFICIO DIF-DSP-6951-2025/pc**, de fecha 31 de octubre de 2025, emitido por el Departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó al Departamento de Planificación de Proyectos la realización de avances físicos de los siguientes proyectos:

- AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO

Así mismo se realizaron avances administrativos en los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS
- CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO
- CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS.
- CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS.
- CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS.

Lo anterior, se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de octubre de 2025.

Se adjunta cuadro firmado y sellado por mi persona y por el Director General del Deporte y la Recreación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Atentamente,

*Ing. Yidja Giron Gutiérrez*  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c DIF

OFICIO DIF-PLANI-6962-2025/mr  
Guatemala, 31 de octubre de 2025.

Ingeniera  
Yidja Girón Gutiérrez  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación



Estimada Ingeniera

Es grato para mi saludarla y al mismo tiempo trasladar el Comprobante de ejecución de metas del mes de octubre de los proyectos en ejecución de la Dirección de infraestructura Física.

Se informa que mediante oficio DIF-DSP-6951-2025/pc de fecha 31 de octubre de 2025, emitido por el departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó a este departamento que se realizaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas (campo de futbol), aldea San Agustín, Chahal, Alta Verapaz
- Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas Cabecera Municipal, Cajola, Quetzaltenango

Asi mismo se realizaron avances administrativos de los siguientes proyectos:

- Construcción Parque Deportivo Y Recreativo Aldea Los Mixcos Palencia, Guatemala
- Construcción Instalaciones Deportivas Y Recreativas Caserío Las Delicias, Ayutla, San Marcos
- Construcción Instalaciones Deportivas Y Recreativas (Polideportivo), Aldea Los Bordes De Barillas, El Jícaro, El Progreso
- Construcción Cancha Polideportiva Caserío Las Morenas, La Blanca, San Marcos
- Construcción Cancha Polideportiva Colonia La Blanquita, La Blanca, San Marcos
- Construcción Cancha Polideportiva Centro Urbano, La Blanca, San Marcos

Debido a lo anterior se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de octubre de 2025.

Deferentemente



Ing. Mauricio Leonel Ramírez Guzmán  
Jefe de Planificación de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación

Dirección de Infraestructura Física  
6a. Calle y 6a. Avenida, Zona 1, Palacio Nacional de la Cultura Teléfono: +502 2355-3939  
Correo: direccioninfraestructura@mcd.gob.gt

Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)





SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecución de Metas por Programa

Fecha emisión : 31/10/2025  
Hora emisión : 17:41:31  
Página : 2 de 2

Periodo/Mes : octubre

| SNIP                                                                         | Nombre                                                                                                                                                      | Unidad de Medida | Ejecutado |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Programa : CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (Pr-Sp-Py) |                                                                                                                                                             |                  |           |
| Estructura : 13-0-1                                                          |                                                                                                                                                             |                  | 352.28    |
| 239667                                                                       | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLA, QUETZALTENANGO                                                              | Metro cuadrado   | 214.50    |
| 244285                                                                       | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS                                                                | Metro cuadrado   | .00       |
| 278737                                                                       | AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ                                                | Metro cuadrado   | 137.78    |
| 285300                                                                       | AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ                                 | Metro cuadrado   | .00       |
| 297782                                                                       | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), PARAJE POGUART ZONA 3, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO                                     | Metro cuadrado   | .00       |
| 298222                                                                       | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABANAS, ZACAPA                                                       | Metro cuadrado   | .00       |
| 298794                                                                       | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA                                                                             | Metro cuadrado   | .00       |
| 299365                                                                       | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO                                   | Metro cuadrado   | .00       |
| 300329                                                                       | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO LA CANCHA, MORALES, IZABAL                                                       | Metro cuadrado   | .00       |
| 300364                                                                       | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,ALDEA BUENA VISTA , CHINAUTLA, GUATEMALA                                                                                 | Metro cuadrado   | .00       |
| 301096                                                                       | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS                                                                               | Metro cuadrado   | .00       |
| 301097                                                                       | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS                                                                              | Metro cuadrado   | .00       |
| 301098                                                                       | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS                                                                                     | Metro cuadrado   | .00       |
| 306712                                                                       | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTON NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO                                        | Metro cuadrado   | .00       |
| 316428                                                                       | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,LOTIFICACION MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA                                        | Metro cuadrado   | .00       |
| 331164                                                                       | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ | Metro cuadrado   | .00       |
| 334748                                                                       | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ                              | Metro cuadrado   | .00       |
| 336815                                                                       | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO                                             | Metro cuadrado   | .00       |

Firma y sello Autoridad máxima






Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

**OFICIO DIF-DSP-6951-2025/pc**  
Guatemala, 31 de octubre de 2025

**Ingeniero**

**Mauricio Leonel Ramírez Guzmán**  
Jefe de Planificación de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física  
Presente




**Estimado Ingeniero Ramírez:**


Reciba un cordial saludo esperando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

Por medio de la presente, me permito informar que se realizó el seguimiento respectivo a los siguientes proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SINIP-, del mes de **octubre**, esto con el fin de continuar con los trámites correspondientes. (se adjunta cuadro y justificaciones).

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Arq. Luis Fernando del Cid López  
Jefe de Supervisión de Proyectos en Funciones  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación

Vo. Bo.   
**Ing. Yidja Girón Gutiérrez**  
Director de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación  
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c. :Departamento de Supervisión de Proyectos



CUADRO DE PROYECTOS Y SU TIPO DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SINIP-.

| NO. | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                      | SEGUIMIENTO    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA.                                        | ADMINISTRATIVO |
| 2   | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO EL PROGRESO | ADMINISTRATIVO |
| 3   | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.                            | ADMINISTRATIVO |
| 4   | CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS.                                                  | ADMINISTRATIVO |
| 5   | CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS.                                          | ADMINISTRATIVO |
| 6   | CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS.                                           | ADMINISTRATIVO |
| 7   | AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ               | FÍSICO         |
| 8   | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO                           | FÍSICO         |





## JUSTIFICACIONES

### “CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA”

- En espera del pago de la estimación final, con base al acta de recepción y liquidación No.3-2025.

### “CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO EL PROGRESO”

- Se rescinde el contrato administrativo DGDR-104-2023 por medio del Acuerdo Ministerial 841-2025 de fecha 03 de septiembre de 2025.

### “CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS”.

- **Problema:** Algunos renglones de trabajo no cumplen con especificaciones técnicas ni diseños en planos del proyecto.
- **Acciones:** Se le solicitó a la empresa constructora que debe apegarse a las especificaciones técnicas y planos constructivos.

### “CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS”

- **Problema:** No se puede dar por finalizado el proyecto ya que aun no se ha recepcionado ni liquidado.
- **Acciones:** La junta de recepción y liquidación debe realizar las actas correspondientes para dar por finalizado el proyecto.

### “CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS”

- **Problema:** No se puede dar por finalizado el proyecto ya que aún no se ha recepcionado ni liquidado.
- **Acciones:** La junta de recepción y liquidación debe realizar las actas correspondientes para dar por finalizado el proyecto.

### “CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS”


- **Problema:** No se puede dar por finalizado el proyecto ya que aún no se ha recepcionado ni liquidado.
- **Acciones:** La junta de recepción y liquidación debe realizar las actas correspondientes para dar por finalizado el proyecto.

### “AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN CHAHAL, ALTA VERAPAZ”

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

### “CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ, QUETZALTENANGO”

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.





Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

**“AMPLIACION INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO  
DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN,  
CHAHAL, ALTA VERAPAZ”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

















Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

**“CONSTRUCCION INSTALACIONES  
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS  
CABECERA MUNICIPAL, CAJOLÁ,  
QUETZALTENANGO”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**







|                                                                                                      |  |  |  |                                                             |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CARRERA MUNICIPAL, CAJAL, QUINTANA ROO |  |  |  | INFORME DE AVANCES A SEGUIR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |  |  |  |
| EJECUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MCDR)                                                    |  |  |  | CÓDIGO DEL PROYECTO: 0508-SC-11-2024                        |  |  |  |
| FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 17 de junio de 2025                                                     |  |  |  | NÚMERO ORIGINAL DE CONTRATO: 239667                         |  |  |  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: 12 de enero de 2026                                                           |  |  |  | MONTOS ACTUALIZADOS DE CONTRATO: \$ 9,135,015.46            |  |  |  |
| FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN:                                                                         |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: 31 de octubre de 2025                 |  |  |  |
|                                                                                                      |  |  |  | NÚM. DE DOCUMENTOS: 239667-31-10-2025                       |  |  |  |
|                                                                                                      |  |  |  | PLANO ORIGINAL (DIAS CALENDARIO)                            |  |  |  |
|                                                                                                      |  |  |  | PROBROGA AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO)                       |  |  |  |
|                                                                                                      |  |  |  | SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DIAS CALENDARIO)            |  |  |  |
|                                                                                                      |  |  |  | TEMPO TRANSCURRIDO (DIAS CALENDARIO)                        |  |  |  |
|                                                                                                      |  |  |  | DIAS CALENDARIO POR EMPLAZAR:                               |  |  |  |
|                                                                                                      |  |  |  | EMPRESA:                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |  |  |  | INGENIERIA Y SERVICIOS GL                                   |  |  |  |

| REGION | DESCRIPCION                              | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES CONTRATADAS |              | ORDEN DE CAMBIO |             | TRABAJO SUPLEMENTARIO |             | ACUERDO DE TRABAJO EXTRA |             | CANTIDADES MODIFICADAS |             | CANTIDADES EJECUTADAS |                      | COSTO EJECUTADO |       | PENDIENTE DE EJECUTAR |            |
|--------|------------------------------------------|----------|------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------|-----------------------|------------|
|        |                                          |          |                  | PRECIO UNITARIO (Q)    | PRECIO TOTAL | CANTIDAD        | COSTO TOTAL | CANTIDAD              | COSTO TOTAL | CANTIDAD                 | COSTO TOTAL | CANTIDAD               | COSTO TOTAL | ESTE PERIODO (Q)      | PERIODO ANTERIOR (Q) | TOTAL (Q)       | %     | CANTIDAD              | VALOR (Q)  |
| 9.01   | Escaleras estructurales                  | 429.81   | m²               | 52.00                  | 22,353.12    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 429.81                | 22,353.12  |
| 9.02   | Andamios estructurales                   | 171.92   | m²               | 34.50                  | 5,931.32     | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 171.92                | 5,931.32   |
| 9.03   | Plataforma tipo 1                        | 68.00    | m²               | 2,441.40               | 166,015.20   | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 68.00                 | 166,015.20 |
| 9.04   | Columnas tipo C-1                        | 242.32   | m                | 604.50                 | 146,455.14   | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 242.32                | 146,455.14 |
| 9.05   | Vigas de concreto                        | 218.39   | m                | 246.00                 | 53,721.60    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 218.39                | 53,721.60  |
| 9.06   | Vigas tipo V-1                           | 420.27   | m³               | 396.00                 | 168,432.00   | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 420.27                | 168,432.00 |
| 9.07   | Losas de gradiente y gradiente de acceso | 91.71    | m²               | 611.00                 | 56,037.10    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 91.71                 | 56,037.10  |
| 9.08   | Asfalto de acceso al estacionamiento     | 46.00    | m²               | 246.00                 | 11,316.00    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 46.00                 | 11,316.00  |
| 9.09   | Pavimento de acceso al estacionamiento   | 328.53   | m²               | 793.00                 | 260,524.29   | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 328.53                | 260,524.29 |
| 9.10   | Vigas empujadas tipo V-1 y V-2           | 46.00    | m²               | 314.88                 | 14,484.48    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 46.00                 | 14,484.48  |
| 9.11   | Sistema de drenaje tipo S-1              | 789.70   | m                | 169.00                 | 133,458.30   | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 789.70                | 133,458.30 |
| 9.12   | Canchales tipo C-1                       | 563.17   | m²               | 195.00                 | 109,818.15   | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 563.17                | 109,818.15 |
| 9.13   | Canchales tipo C-2                       | 94.25    | m²               | 169.00                 | 15,928.25    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 94.25                 | 15,928.25  |
| 9.14   | Canchales tipo C-3                       | 141.49   | m²               | 52.00                  | 7,377.68     | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 141.49                | 7,377.68   |
| 9.15   | Escaleras estructurales                  | 56.40    | m²               | 34.50                  | 1,937.80     | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 56.40                 | 1,937.80   |
| 9.16   | Escaleras estructurales                  | 111.43   | m²               | 234.00                 | 26,074.62    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 111.43                | 26,074.62  |
| 9.17   | Escaleras estructurales                  | 16.45    | m²               | 237.20                 | 3,901.64     | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 16.45                 | 3,901.64   |
| 9.18   | Columnas tipo C-4                        | 6.80     | m                | 237.20                 | 1,611.36     | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 6.80                  | 1,611.36   |
| 9.19   | Columnas tipo C-5                        | 241.40   | m                | 237.20                 | 57,258.80    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 241.40                | 57,258.80  |
| 9.20   | Columnas tipo C-6                        | 67.50    | m                | 237.20                 | 16,000.80    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 67.50                 | 16,000.80  |
| 9.21   | Columnas tipo C-7                        | 7.60     | m                | 237.20                 | 1,800.64     | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 7.60                  | 1,800.64   |
| 9.22   | Columnas tipo C-8                        | 99.74    | m                | 237.20                 | 23,660.88    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 99.74                 | 23,660.88  |
| 9.23   | Columnas tipo C-9                        | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.24   | Columnas tipo C-10                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.25   | Columnas tipo C-11                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.26   | Columnas tipo C-12                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.27   | Columnas tipo C-13                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.28   | Columnas tipo C-14                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.29   | Columnas tipo C-15                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.30   | Columnas tipo C-16                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.31   | Columnas tipo C-17                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.32   | Columnas tipo C-18                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.33   | Columnas tipo C-19                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.34   | Columnas tipo C-20                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.35   | Columnas tipo C-21                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.36   | Columnas tipo C-22                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.37   | Columnas tipo C-23                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.38   | Columnas tipo C-24                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.39   | Columnas tipo C-25                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.40   | Columnas tipo C-26                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.41   | Columnas tipo C-27                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.42   | Columnas tipo C-28                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.43   | Columnas tipo C-29                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.44   | Columnas tipo C-30                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.45   | Columnas tipo C-31                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.46   | Columnas tipo C-32                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.47   | Columnas tipo C-33                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.48   | Columnas tipo C-34                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.49   | Columnas tipo C-35                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.50   | Columnas tipo C-36                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.51   | Columnas tipo C-37                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.52   | Columnas tipo C-38                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.53   | Columnas tipo C-39                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |
| 9.54   | Columnas tipo C-40                       | 202.56   | m                | 237.20                 | 48,048.32    | -               | -           | -                     | -           | -                        | -           | -                      | -           | -                     | -                    | -               | 0.00% | 202.56                | 48,048.32  |

Arq. Douglas José David Paredes Tortola  
Supervisor de Proyectos  
Departamento de Supervisión de Proyectos  
Dirección de Infraestructura Física



|                                                                                                    |  |                             |  |  |                                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| INFORME DE AVANCES A SEGUIR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025                                        |  |                             |  |  |                                                  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CARRETERA MUNICIPAL, CAROL, QUINTA TANTANINGAO |  |                             |  |  |                                                  |  |  |  |  |
| PROYECTO:                                                                                          |  | CODIGO DEL PROYECTO:        |  |  | PLAZO ORIGINAL (DÍAS CALENDARIO)                 |  |  |  |  |
| EJECUTOR:                                                                                          |  | 0008-SC-11-2024             |  |  | PRORROGA AUTORIZADA (DÍAS CALENDARIO)            |  |  |  |  |
| NÚMERO DE CONTRATO:                                                                                |  | 239667                      |  |  | SUSPENSIÓN TEMPORAL AUTORIZADA (DÍAS CALENDARIO) |  |  |  |  |
| FECHA DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:                                                            |  | IMP:                        |  |  | PLAZO MODIFICADO (DÍAS CALENDARIO)               |  |  |  |  |
| 17 de julio de 2025                                                                                |  | MONTTO ORIGINAL DE CONTRATO |  |  | TÉRMINO DE PLAZO MODIFICADO (DÍAS CALENDARIO)    |  |  |  |  |
| 12 de enero de 2025                                                                                |  | ACTUALIZACIÓN DE CONTRATO:  |  |  | PLAZO MODIFICADO POR EMPEZAR                     |  |  |  |  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN:                                                                             |  | FECHA DE ELABORACIÓN:       |  |  | DIFERENCIA                                       |  |  |  |  |
| 12 de enero de 2025                                                                                |  | 31 de octubre de 2025       |  |  | INGENIERIA Y SERVICIOS QI                        |  |  |  |  |
| FECHA NUEVA DE FINALIZACIÓN:                                                                       |  | NÚM. DE DOCUMENTO:          |  |  |                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |  | 239667-31-10-2025           |  |  |                                                  |  |  |  |  |













Licenciada

Lizeth Alvarizaes Nájera de Barrios

Subdelegada de Recursos Humanos

Dirección General del Deporte y la Recreación

Presente

Licenciada Alvarizaes:

De manera atenta me dirijo a usted, deseando éxitos en el desempeño de sus labores.

En atención al Oficio DRRHHVDR-3349-2025-MLAN-pmmc, en el cual remite el reporte del registro de asistencia del mes de septiembre 2025, reflejando el marcaje de asistencia en el reloj biométrico, en el cual se observan inconsistencias, por lo que recuerda que son 50 minutos de tolerancia el tiempo establecido y reitera la importancia de marcar asistencia, cada servidor debe contar con 4 registros diarios para evitar inconvenientes en el record laboral y sanciones administrativas por parte de los entes fiscalizadores, debiendo enviar las justificaciones de respaldo correspondiente a cada falta de marcaje.

Por lo antes expuesto, se detallan a continuación los días específicos de estas incidencias:

01/09/2025 – Desconozco por qué motivo no tengo marcaje de almuerzo, ya que salí a las 12:58 y regrese a las 13:17 horas.

02/09/2025 – Curso de INAP "Trabajo en Equipo en la Administración Pública" de 9:00 a 11:00 horas, regrese a las 13:17 horas y por gestiones administrativas de urgencia no tome horario de almuerzo.

03/09/2025 – Reunión tema "Manual de Normas y Procedimientos" y Formato nuevo en la Dirección General del Deporte y la Recreación.

04/09/2025 – Desconozco por qué motivo no tengo marcaje de almuerzo, ya que salí a las 13:00 y regrese a las 13:21 horas.

05/09/2025 – Desconozco por qué motivo no tengo marcaje de almuerzo, ya que salí a las 13:07 y regrese a las 13:25 horas.

08/09/2025 – Debido a seguimiento por requerimiento de Contraloría General de Cuentas y Actualización del Plan Operativo Anual al mes de agosto, no pude marcar la hora de almuerzo.

09/09/2025 – Curso de INAP "Trabajo en Equipo en la Administración Pública" de 9:00 a 11:00 horas, posterior a ello tuve una reunión con la Dirección de Planificación y Modernización respecto a la Ficha de Identificación de Programas Sociales para incluir el beneficio de Juego Limpio, en virtud de lo anterior, no me fue posible marcar horario de almuerzo.

10/09/2025 – Reunión de la Junta de Cotización Pública No. DGDR-SC-C-49-2025 "ADQUISICIÓN DE GORRAS DEPORTIVAS PARA FOMENTAR LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, LA DIRECCIÓN DE ÁREAS SUSTANTIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN" en la cual fui nombrada, para revisión de las muestras presentadas por los oferentes.

11/09/2025 – Por motivo de seguimiento a la Actualización del Plan Operativo Anual correspondiente al mes de agosto y seguimiento al requerimiento de Contraloría General de Cuentas, no me fue posible realizar mi marcaje en horario de almuerzo.





Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

12/09/2025 – En el marco del Programa de Motivación, Recreación y Convivencia 2025, se realizó el Torneo de Independencia de Fútbol 7, dirigido por la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Planificación y Modernización Institucional según CIRCULAR DRH-139-2025/grfa/KZDLCD, a partir de las 13:00 a 17:00 horas, en las instalaciones del Parque Erick Bernabé Barrondo García. Por lo que me retire a las 12:12 horas.

16/09/2025 – Por seguimiento a la Actualización del Plan Operativo Anual al mes de agosto y gestión de firmas en la Dirección General del Deporte y la Recreación, no pude marcar la hora de regreso de almuerzo.

17/09/2025 – Desconozco por qué motivo no tengo marcaje de almuerzo, ya que salí a las 13:29 y regrese a las 14:03 horas.

19/09/2025 – Desconozco por qué motivo no tengo marcaje de regreso de almuerzo, ya que salí a las 13:19 y regrese a las 14:20 horas.

22/09/2025 – No me fue posible marcar en mi horario de almuerzo ya que tuve reunión con UDAF por tema de ejecución de proyectos prioritarios.

23/09/2025 – Desconozco por qué motivo no tengo marcaje de almuerzo, ya que salí a las 13:01 y regrese a las 13:19 horas.

24/09/2025 – Reunión con UDAF en seguimiento a la ejecución de proyectos prioritarios y posterior reunión con la Directora General en relación al mismo tema en horario de 16:30 a 18:30 horas.

29/09/2025 – Tome el día por motivo de cumpleaños.

30/09/2025 – Por la mañana me presente al Curso de INAP "Trabajo en Equipo en la Administración Pública" en horario extendido de 9:00 a 14:00 horas, ya que la sesión del día martes 23 de septiembre había sido cancelada. Al regresar estuve en el Palacio Nacional de la Cultura dándole seguimiento al Acta de Recepción de Pelotas de Fútbol a la cual fui nombrada según **OFICIO VDR-2197-2025**.

Agradeciendo la atención al presente, sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

C.c. Archivo

---

Delegación de Planificación y Modernización, Dirección General del Deporte y la Recreación  
7a. av. 3-67, Zona 2 Guatemala, ciudad | Teléfono: +502 32936770  
Correo: [planificacióndeporte@mcd.gob.gt](mailto:planificacióndeporte@mcd.gob.gt)

Síguenos como **Cultura y Deportes**     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

| No. | SNIP   | NOG      | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                  | UBICACIÓN FÍSICA                            | CONSTRUCTORA                          | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COTIZACIÓN Y/O LICITACIÓN | COSTO ADJUDICADO /CONTRATADO | COSTO MODIFICADO | ANTICIPO OTORGADO | ESTIMACIONES PAGADAS | SAUDO POR PAGAR | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES                                                                                                 |
|-----|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 244285 | 1729002  | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO SAN MARCOS                               | CASERO LAS DECIAS, ATITLAN, SAN MARCOS      | MULTISERVICIOS DEL NOROCCIDENTE       | CONSITE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, LEONARDO, SERVICIOS SANITARIOS, VESTIDORES, MODULO DE GRADEROS, ILUMINACIÓN MARCOS Y POSTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LICITACIÓN                | Q 3 140 350.00               | Q -              | Q -               | Q 349 815.08         | Q 2 810 484.92  | 1 335                     | 80.48%        | 11.07%            | Se realizan correcciones a los trabajos ejecutados por parte de la supervisión del proyecto.                  |
| 2   | 29374  | 18437060 | CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MARCOS, ATITLAN, GUATEMALA                                                      | ALDEA LOS MARCOS, PALERCA, GUATEMALA        | HO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA        | CONSITE EN LA CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PARQUE EXISTENTE EN LA ALDEA LOS MARCOS, EN EL CANTÓN DE ATITLAN, PARA EFECTOS DE INFORMACIÓN PARA BRINDAR A LOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LICITACIÓN                | Q 11 099 600.00              | Q 12 942 286.62  | Q -               | Q 6 987 800.44       | Q 5 370 835.06  | 6 179                     | 100.00%       | 53.99%            | En espera del pago de la estimación por recepción por parte de la junta de recepción y liquidación No 3 2025. |
| 4   | 301098 | 23697918 | CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS                                                               | CENTRO URBANO LA BLANCA, SAN MARCOS         | CONSTRUCTORA MERIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA | CONSITE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, MODULO DE GRADEROS + ESTRUCTURA METALICA, CASETA + ILUMINACIÓN EN CANCHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COTIZACIÓN                | Q 580 017.01                 | Q 609 915.29     | Q 114 003.40      | Q 334 440.94         | Q 56 637.24     | 8 721                     | 100.00%       | 89.89%            | En espera del acta de recepción por parte de la junta de recepción y liquidación                              |
| 5   | 301097 | 23697922 | CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS                                                               | COLONIA LA BLANCA, SAN MARCOS               | CONSTRUCTORA MERIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA | CONSITE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, MODULO DE GRADEROS, ESTRUCTURA METALICA, CASETA + ILUMINACIÓN EN CANCHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COTIZACIÓN                | Q 601 477.56                 | Q 621 591.24     | Q120 294.51       | Q 334 440.94         | Q 61 223.29     | 8 721                     | 100.00%       | 89.80%            | En espera del acta de recepción por parte de la junta de recepción y liquidación                              |
| 6   | 301096 | 23692022 | CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CASERO LAS MORIAS LA BLANCA, SAN MARCOS                                                            | CASERO LAS MORIAS LA BLANCA, SAN MARCOS     | CONSTRUCTORA MERIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA | CONSITE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, MODULO DE GRADEROS, ESTRUCTURA METALICA, CASETA + ILUMINACIÓN EN CANCHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COTIZACIÓN                | Q388 992.56                  | Q 413 655.99     | Q117 998.56       | Q 334 443.87         | Q 60 054.54     | 3 000                     | 100.00%       | 89.80%            | En espera del acta de recepción por parte de la junta de recepción y liquidación                              |
| 7   | 278737 | 24402889 | AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO AGUIN, CHANAL, ATITLAN, VERAPAZ            | ALDEA SAN AGUSTIN, CHANAL, ATITLAN, VERAPAZ | ARQUITECTURA E INGENIERIA TOTAL       | CONSITE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, GRADEROS, INSTALACIONES PUJUALES, ELECTRICAS, MODULO DE VESTIDORES Y SERVICIOS SANITARIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LICITACIÓN                | Q 9 200 000.00               | Q 10 892 429.07  | Q -               | Q 3 245 388.26       | Q 7 447 157.79  | 2320                      | 31.65%        | 29.79%            | El proyecto se encuentra en ejecución.                                                                        |
| 8   | 278667 | 24129135 | CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO CABECERA MUNICIPAL CAJOLA, QUETZATENANGO | ALDEA SAN AGUSTIN, CAJOLA, QUETZATENANGO    | INGENIERIA Y SERVICIOS DE CL          | CONSITE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS DE GRADEROS DE CONCRETO CON SUS RESPECTIVO TECHO, 1 CANCHA DE FUTBOL DE Césped sintético, 2 MÓDULOS DE VESTIDORES GUARDAMÍA Y CASETA PARA LOS EQUIPOS, 1 MÓDULO DE VESTIDORES SANITARIOS, MOBILIA 1.72 MAS VESTIDORES PARA AMBITOS CON SUS RESPECTIVAS MEDIDAS SE SEGURIDAD, LAS INSTALACIONES CONFORMAN CON SUS FERRAMENTALES EN EL PERIMETRO DE TODAS LAS INSTALACIONES Y EN EL PERIMETRO DEL CAMPO DE FUTBOL, SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CONSUMO, SISTEMA DE AGUA PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO, Y BAÑOS PUJUALES, SISTEMA DE DRENAR DE SANITARIO DE CONJUNTO, SISTEMA ELÉCTRICO DE CONJUNTO). | LICITACIÓN                | Q 9 133 018.44               | Q -              | Q -               | Q 1 645 291.06       | Q 7 487 727.40  | 8664                      | 20.08%        | 18.01%            | El proyecto se encuentra en ejecución.                                                                        |

Dirección de Infraestructura Física  
 Calle 7 de Agosto, 200, Edificio 10, Torre 10, Centro  
 Ciudad de México, México D.F. 06702  
 Teléfono: 52 55 5623 1111 ext. 2000  
 Correo: [info@infraestructura.fisica.gob.mx](mailto:info@infraestructura.fisica.gob.mx)  
[www.mexico.gob.mx](http://www.mexico.gob.mx)

Arq. Luis Fernando del Cid-López  
Jefe de Supervisión de Proyectos en Funciones  
Dirección de Infraestructura Física  
Dirección General del Deporte y la Recreación





Ministerio de  
**Cultura y Deportes**

Oficio DPMI-DGA 246-2025  
Guatemala 23 de octubre de 2,025


Licenciada  
**Mariela Alejandra Morataya Contreras**  
Directora de Planificación y Modernización Institucional  
Ministerio de Cultura y Deportes  
Presente



Respetable Licenciada Morataya:

Después de saludarla cordialmente, remito informe de avance del Proyecto 299346 Construcción Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias Guatemala, Guatemala, al mes de octubre del presente, para lo anterior se adjunta: Información General del Proyecto, informe del supervisor de la obra, informe fotográfico, comprobante de ejecución de metas por programa, lo anterior para que se remitido a los órganos correspondientes. Al presente se adjuntan veintidós folios inclusive.

De usted con estima y consideración,

  
MSol. Froilán Tistoj Chan  
Delegado de Planificación y Modernización  
Dirección General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes

Atentamente,

Vo. Bo.

  
Mtr. Ana Olivia Castañeda Arroyo  
Directora General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes

c.c. Archivo

**DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN**

7a. Avenida 3-67 Zona 2

Correo: [planificaciondga@mcd.gob.gt](mailto:planificaciondga@mcd.gob.gt)

Síguenos como Cultura y Deportes     [www.mcd.gob.gt](http://www.mcd.gob.gt)



Periodo/Mes : octubre

| SNIP | Nombre | Unidad de Medida | Ejecutado |
|------|--------|------------------|-----------|
|------|--------|------------------|-----------|


Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES  
Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

| Programa                                  | Estructura | Unidad /medida | Ejecutado |
|-------------------------------------------|------------|----------------|-----------|
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ARTISTICA | 11-0-1     | Metro cuadrado | 4.55      |

Firma encargada  
M.Sc. Tzuc Chan  
Director General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma  
M.Sc. Tzuc Chan  
Director General de las Artes  
Ministerio de Cultura y Deportes





SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SNIP-  
Comprobante de ejecución de Metros por Programa

Fecha emisión : 23/10/2025  
Hora emisión : 15:08:27  
Página : 2 de 2

Periodo/Mes : octubre

| SNIP                                                 | Nombre                                                                                        | Unidad de Medida | Ejecutado |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Programa : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA | (Pr-Sp-Py)                                                                                    |                  |           |
| 299346                                               | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA | Metro cuadrado   | 4.55      |





Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-

Fecha Emisión: 23/10/2025  
Hora: 04:17 PM

0299346 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL  
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA

Información General del Proyecto

SNIPgt

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo  
CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS  
GUATEMALA, GUATEMALA

Institución responsable: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Unidad ejecutora responsable: DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

Modalidad de planificación : Plan sectorial

Modalidad específica: Plan sectorial

Finalidad-Función-Division:

Función anterior: CULTURA Y DEPORTES  
Sub-función anterior : CULTURA Y DEPORTES  
9 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION  
2 - SERVICIOS CULTURALES  
1 - SERVICIOS DE CULTURALES

Ubicación geográfica:

| Departamento | Municipio |
|--------------|-----------|
| GUATEMALA    | GUATEMALA |

Área de influencia: Departamental

Responsables:

Responsable del proyecto:

Nombre: Ana Olivia Castañeda Arroyo  
Cargo: Directora General de las Artes  
Teléfono: 22395000  
Email: aocastaneda@mcd.gob.gt

Formulador del proyecto:

Nombre: Lorenzo Froilán Tistoj Chan  
Cargo: Delegado de Planificación  
Teléfono: 50186379  
Email: ftistojc@mcd.gob.gt

Modalidad de ejecucion del Proyecto : CONTRATO

DIAGNÓSTICO:

Antecedentes:

Las dependencias que conforman el Ministerio de Cultura y Deportes se encuentra la Dirección General de las Artes, la cual tiene como objetivo, propiciar los espacios de fomento y difusión de las diferentes expresiones de las artes; a su vez tiene a cargo el Fomento y Difusión de las Artes, dentro de las cuales se encuentran tres áreas dedicadas a la danza específicamente lo referente al ballet, disciplina al que el proyecto busca unificar dentro de instalaciones adecuadas a las especificaciones necesarias para el estudio, práctica y exhibición de este arte. Los responsables del desarrollo de esta práctica son: Ballet Moderno y Folklórico, Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux y Ballet Nacional de Guatemala.

El Ballet Moderno y Folklórico fue fundado a solicitud de la Dirección General de las Artes, por acuerdo Gubernativo del uno de octubre de 1,964, adscrito al departamento de danza, con la aprobación y apoyo del Ministerio de Educación. En la actualidad depende del Ministerio de Cultura y Deportes entre sus principales objetivos se destacan: Dar a conocer a toda la población la extrema densidad cultural que posee la nación guatemalteca, difundir y promover la música, la danza tradicional, así como la práctica y difusión de la danza moderna.

El surgimiento de La Escuela Nacional de Danza está íntimamente ligado con la creación del Ballet Guatemala, en 1947 llega a Guatemala Madame Marcelle Bonge de Devaux y su esposo Jean Devaux, quienes residían en Colombia, con el propósito de formar un grupo de ballet. El proceso de formación que Madame Marcelle propuso fue preparar a las y los bailarines en 3 niveles siendo un primer nivel para principiantes y los otros dos niveles para intermedios y avanzados, con esta planificación los esposos Devaux trabajaron los siguientes dos años.





## Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-

Fecha Emisión: 23/10/2025  
Hora: 04:17 PM

0299346 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL  
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA

### Información General del Proyecto

SNIPgt

#### Problemática / Arbol del Problema:

##### Efectos Indirectos

a) Limitado desarrollo social.b) Limitados espacios idóneos por parte de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca para la practica y desarrollo de la danza en sus diferentes disciplinas.

##### Efectos Directos

a) Aumento de la pobreza extrema.b) Limitado mercado laboral a la población en edad productiva.c) Perdida de la identidad de los guatemaltecos.d) Altos índices de delincuencia juvenil.

#### PROBLEMA CENTRAL:

Deficiente infraestructura para la formación, práctica y presentación de la danza en sus diferentes expresiones.

##### Causas Indirectas

a) Falta de talento humano para la elaboración y desarrollo de proyectos de inversión pública.b) Falta de aplicación de la legislación en materia cultural y artística.

##### Causas Directas

a) Falta de interés del sector político para el desarrollo de la danza en sus diferentes expresiones.b) Falta de gestión ante los diferentes cooperantes para la dotación de infraestructura.c) Subestimación de la profesión del arte con especialidad en danza con relación a otras disciplinas.d) Falta de estrategia para la difusión de la formación y práctica de la danza.e) Carencia de legislación específica en materia artística.

#### ALTERNATIVAS DE SOLUCION

**Alternativa 01 :** Se plantea la construcción de un edificio el cual proveerá de áreas para el estudio, practica y exhibición de varias disciplinas relacionadas con el arte de la danza, albergando a 3 instituciones, la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux, El Ballet Nacional de Guatemala y Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala.

**TIR :** - 34.00      **VAN :** \*\*\*\*\*      **CAE :** 3,022,216.00

**Alternativa 02 :** Se plantea el remozamiento de las áreas existentes, remozando los salones, bodega, piso, paredes, etc. y equipando con las herramientas necesarias para la realización de sus actividades, cumpliendo con los estándares necesarios que este tipo de actividades necesita.

**TIR :** - 61.00      **VAN :** -2,976,623,101.61      **CAE :** 27,326,116.57

**Alternativa 03 :** Se plantea la creación de programas de promoción, los cuales serán transmitidos por televisión, radio, redes sociales, medios escritos, etc. Estos serán transmitidos en diferentes idiomas para abarcar la mayor población posible.

**TIR :** - 52.00      **VAN :** -2,981,623,101.61      **CAE :** 27,928,199.89

#### Justificación:

El edificio de la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux es una construcción que data del año 1927, fue construido en el gobierno del presidente Lázaro Chacón con el propósito de ser el internado de los estudiantes de música que llegaban del interior del país. Posteriormente alrededor de 1954 deja de ser internado y se convierte en la sede de la Escuela Nacional de Danza y del Ballet Nacional de Guatemala. Por el tiempo que tiene y por ubicarse en el Centro Histórico la construcción es considerada como Patrimonio.

El edificio que alberga la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux, y Ballet Ncional de Guatemala se encuentra en avanzado deterioro, y no responde a las exigencias actuales para la práctica y desarrollo de la danza y sus diversas expresiones, por lo que es de vital importancia la dotación de una infraestructura que responda a las demandas actuales que exige la disciplina identificada.

Por su parte Ballet Moderno y Folklórico no cuenta con una sede para la practica y desarrollo de la danza contemporánea y moderna.

#### Descripción AJUSTADA:

El edificio esta conformado por tres niveles un sotano y terraza El sotano esta destinado para el uso vehicular de los visitantes del Edificio de la Danza cuenta con bodegas de almacenamiento para cada una de las Instituciones Artisticas bodega de mantenimiento cuarto de bombas hidraulicas cuarto electrico y dos modulos de circulacion





## Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-

Fecha Emisión: 23/10/2025  
Hora: 04:17 PM

0299346 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL  
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA

### Información General del Proyecto

SNIPgt

vertical con gradas y elevador de carga El primer nivel cuenta con plaza vestibulo recepcion con area de espera instalaciones administrativas de Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux sala de lectura biblioteca videoteca y servicios sanitarios para el publico en general La circulacion al centro del edificio conduce al auditorio con capacidad para 126 personas de frente a esta zona que se encuentra el area de estar comun para las tres Instituciones cuenta con area de mesas cocineta sala de estar servicios sanitarios estudio de grabacion sala de reuniones salon de profesores en este mismo nivel continuo al auditorio se encuentran las oficina administrativas del Ballet Nacional de Guatemala asi como camerinos servicios sanitarios duchas dos talleres de enseñanza y taller principal El segundo nivel esta destinado a siete talleres de enseñanza dos para uso del Ballet Nacional de Guatemala y cinco para la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux asimismo cuenta con tres aulas destinadas al estudio teorico servicios sanitarios con duchas dos terrazas y gimnasio como areas comunes El tercer nivel esta destinado al uso del Ballet Moderno y Folklorico Nacional de Guatemala cuenta con area administrativa dos salones de enseñanza un salon principal con area de vestuario area para las marimbas modulo de camerinos servicios sanitarios con duchas y una terraza El edificio cuenta con un cuarto nivel de terraza dispuesto para colocar paneles solares.

#### Objetivos:

##### General:

Garantizar la formación artística, de la población guatemalteca a través del funcionamiento óptimo del Edificio de la Danza, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ciudad de Guatemala, Guatemala en beneficio de la sociedad guatemalteca con pertinencia étnica, cultural y de género.

##### Específicos:

Dotar de infraestructura adecuada a la Escuela Nacional de Danza, Ballet Nacional de Guatemala y Ballet Moderno y Folklorico;

Garantizar el proceso de formación de alto nivel de personas en el arte de la danza en sus diferentes especialidades;

Establecer mecanismos para el rescate y valoración de la danza en sus diferentes especialidades;

Desarrollar la investigación sistemática de la danza, su enseñanza, promoción y difusión a nivel nacional e internacional;

Establecer procesos académicos para la formación de artistas especializados en danza en sus diferentes especialidades.

#### Resultados esperados:

Brindar mejores condiciones a la población guatemalteca a través de la prestación de servicios de la formación, fomento y difusión de la artes.

#### Beneficiarios :

##### Tipificacion de la población :

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Población Afectada   | 735,487 |
| Población Objetivo   | 176     |
| Población Proyectada | 108,090 |

##### Caracterización de la poblacion por EDAD :

##### Hombres :

##### Mujeres :

Menores de 4 años  
De 5 a 13 años  
De 14 a 18 años  
De 19 a 28 años  
De 29 a 50 años  
De 51 a 60 años  
De 61 en adelante

20

19

20

5

41

32

36

3





Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-

Fecha Emisión: 23/10/2025  
Hora: 04:17 PM

0299346 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL  
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA

Información General del Proyecto

SNIPgt

Clasificación por ETNIA :

|          |     |
|----------|-----|
| Maya     | 8   |
| Xinca    |     |
| Garifuna |     |
| Otro     | 168 |

Clasificación por ZONA :

|        |     |
|--------|-----|
| Urbana | 176 |
| Rural  |     |

Costo/eficiencia:

TIR:

%

VAN:

Empleo a requerir:

|               | Durante la ejecución<br>en hombre/mes | Durante la operación<br>en hombre/mes |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Calificada    |                                       |                                       |
| No calificada |                                       |                                       |

Situación del terreno:

Ninguno

Diseños (especificaciones):

Vida útil del proyecto:

50 años

Fecha de inicio de la operación:

02-JAN-24

Institución responsable de operación:

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Costo anual de operación:

|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| REMUNERACIONES           | 8,541,709 | Quetzales |
| BIENES Y SERVICIOS       | 3,206,777 | Quetzales |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,516,233 | Quetzales |





Información Técnica AJUSTADA:

Duracion del proyecto: Inicio: 03/10/2022

Finalización : 30/04/2026

Duración : 43 meses.

Meta GLOBAL del proyecto : CONSTRUCCION EDIFICIO

6,426.20 Metro cuadrado

Costo TOTAL del proyecto Q.: 78,874,595.75

Metas ANUALES del proyecto :

| Año   | Descripción de la meta | Unidad de medida | Vigente   | % Ejec. |
|-------|------------------------|------------------|-----------|---------|
| 2,026 | CONSTRUCCION EDIFICIO  | Metro cuadrado   | .00       | .00     |
| 2,025 | CONSTRUCCION EDIFICIO  | Metro cuadrado   | 800.00    | .57     |
| 2,024 | CONSTRUCCION EDIFICIO  | Metro cuadrado   | 47,790.36 | .00     |
| 2,023 | CONSTRUCCION EDIFICIO  | Metro cuadrado   | 7,790.36  | 72.22   |

Programación FISICA Multianual

| Rubro | Unidad de medida | Program. |
|-------|------------------|----------|
|-------|------------------|----------|

2,023

|                                                        |       |        |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|
| Trabajos preliminares                                  | m²    | 15,098 |
| Estructuras (incluye muros, techos y/o encaminamiento) | m²    | 24,310 |
| Cimentación                                            | Metro | 462    |

2,025

|                                                        |                 |        |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Trabajos preliminares                                  | m²              | 31     |
| Estructuras (incluye muros, techos y/o encaminamiento) | m²              | 18,900 |
| Cimentación                                            | Metro           | 12     |
| Acabados                                               | m²              | 32,589 |
| Obra exterior y complementaria                         | Maquina         | 2,105  |
| Equipamiento                                           | m³              | 433    |
| Puertas y ventanas                                     | Artículo de mad | 86     |

Programación FISICA Mensual

| Rubro | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|

2,023

|                             |  |  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Trabajos preliminares       |  |  |  |  | 2,258 | 2,258 | 1,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 1,288 | 1,262 |
| Estructuras (incluye muros) |  |  |  |  |       | 1,993 | 3,059 | 3,746 | 3,746 | 3,746 | 3,973 | 4,047 |
| Cimentación                 |  |  |  |  |       | 462   |       |       |       |       |       |       |
| Acabados                    |  |  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Obra exterior y compleme    |  |  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Equipamiento                |  |  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Puertas y ventanas          |  |  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |

2,025

|                             |  |  |  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Trabajos preliminares       |  |  |  |  | 31    |       |       |       |       |       |       |       |
| Estructuras (incluye muros) |  |  |  |  | 1,726 | 2,381 | 852   | 2,485 | 3,974 | 3,758 | 2,378 | 1,347 |
| Cimentación                 |  |  |  |  | 12    |       |       |       |       |       |       |       |
| Acabados                    |  |  |  |  | 4,328 | 3,202 | 5,612 | 3,121 | 1,134 | 3,646 | 5,258 | 6,288 |
| Obra exterior y compleme    |  |  |  |  | 39    | 3     | 36    | 1,218 | 18    | 34    | 4     | 752   |
| Equipamiento                |  |  |  |  | 433   |       |       |       |       |       |       |       |



0299346 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL  
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA

## Información General del Proyecto

SNIP<sub>gt</sub>[illegible]**Información FINANCIERA del Proyecto:**

## RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

| Ejercicio | Solicitado    | Asignado      | Ejecutado     | % Financiero | % Físico |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 2026      | 10,415,063.72 | .00           | .00           | .00          | .00%     |
| 2025      | 49,862,760.93 | 4,251,388.00  | .00           | .00          | .57%     |
| 2024      | .00           | .00           | .00           | .00          | .00%     |
| 2023      | 18,596,771.10 | 19,098,766.00 | 18,596,771.10 | 97.37        | 72.22%   |
| 2022      | .00           | .00           | .00           | .00          | .00%     |
|           |               |               | 18,596,771.10 |              |          |


Avance Financiero: .00%

| Fuente de<br>Financiamiento | Solicitado<br>2022 | Monto<br>Vigente | Desembolsado<br>MINFIN | Ejecutado<br>2022 |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL :</b>              |                    |                  |                        |                   |
| <b>Recursos internos :</b>  |                    |                  |                        |                   |
| Gobierno central :          |                    |                  |                        |                   |
| Comunidad :                 |                    |                  |                        |                   |
| Aporte municipal :          |                    |                  |                        |                   |
| Otros aportes :             |                    |                  |                        |                   |
| <b>Otras fuentes :</b>      |                    |                  |                        |                   |



Avance Financiero: 97.37%

| Fuente de<br>Financiamiento | Solicitado<br>2023 | Monto<br>Vigente | Desembolsado<br>MINFIN | Ejecutado<br>2023 |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL :</b>              | 18,596,771         | 19,098,766       |                        | 18,596,771        |
| <b>Recursos internos :</b>  | 18,596,771         | 19,098,766       |                        | 18,596,771        |
| Gobierno central :          | 18,596,771         | 19,098,766       |                        | 18,596,771        |
| Comunidad :                 |                    |                  |                        |                   |
| Aporte municipal :          |                    |                  |                        |                   |
| Otros aportes :             |                    |                  |                        |                   |
| <b>Otras fuentes :</b>      |                    |                  |                        |                   |

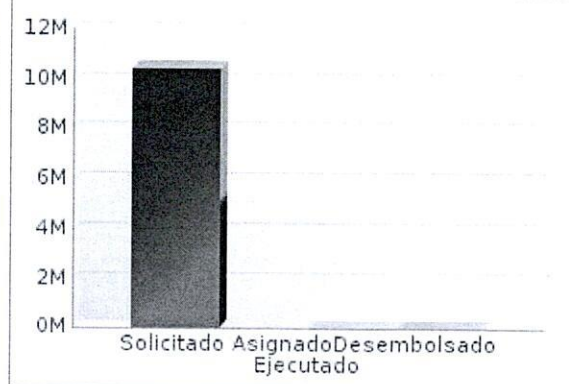

Avance Financiero: .00%

| Fuente de<br>Financiamiento | Solicitado<br>2024 | Monto<br>Vigente | Desembolsado<br>MINFIN | Ejecutado<br>2024 |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL :</b>              |                    |                  |                        |                   |
| <b>Recursos internos :</b>  |                    |                  |                        |                   |
| Gobierno central :          |                    |                  |                        |                   |
| Comunidad :                 |                    |                  |                        |                   |





Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-

Fecha Emisión: 23/10/2025  
Hora: 04:17 PM

0299346 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL  
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA

Información General del Proyecto

SNIPgt

Aporte municipal :


Otros aportes :

Otras fuentes :

Avance Financiero:

.00%

| Fuente de<br>Financiamiento | Solicitado<br>2025 | Monto<br>Vigente | Desembolsado<br>MINFIN | Ejecutado<br>2025 |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| TOTAL :                     | 49,862,761         | 4,251,388        |                        |                   |
| Recursos internos :         | 49,862,761         | 1,724,938        |                        |                   |
| Gobierno central :          | 49,862,761         | 1,724,938        |                        |                   |
| Comunidad :                 |                    |                  |                        |                   |
| Aporte municipal :          |                    |                  |                        |                   |
| Otros aportes :             |                    |                  |                        |                   |
| Otras fuentes :             |                    | 2,526,450        |                        |                   |

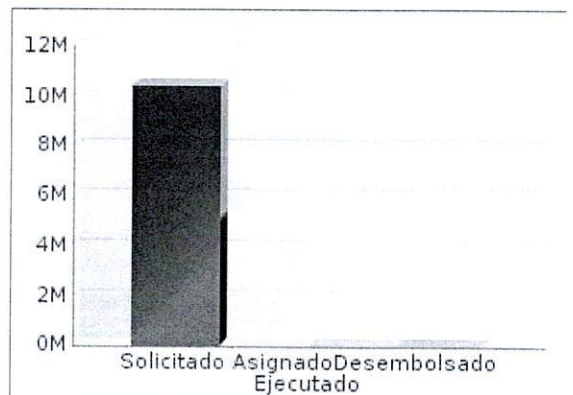

Avance Financiero:

.00%

| Fuente de<br>Financiamiento | Solicitado<br>2026 | Monto<br>Vigente | Desembolsado<br>MINFIN | Ejecutado<br>2026 |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| TOTAL :                     | 10,415,064         |                  |                        |                   |
| Recursos internos :         | 10,415,064         |                  |                        |                   |
| Gobierno central :          | 10,415,064         |                  |                        |                   |
| Comunidad :                 |                    |                  |                        |                   |
| Aporte municipal :          |                    |                  |                        |                   |
| Otros aportes :             |                    |                  |                        |                   |
| Otras fuentes :             |                    |                  |                        |                   |



PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

| Fuente de<br>Financiamiento | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 2022                        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| TOTAL                       |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Recursos internos           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Gobierno central :          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |









**Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-**

Fecha Emisión: 23/10/2025  
Hora: 04:17 PM

**0299346 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL  
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS GUATEMALA, GUATEMALA**

**Información General del Proyecto**

**SNIPgt**

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aporte municipal : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros aportes :    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras fuentes:     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| PLAZO DEL CONTRATO                                           | 12 MESES |
| PLAZO ACTUALIZADO                                            | 340 DÍAS |
| TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS CALENDARIO                       | 340 DÍAS |
| DÍAS CALENDARIO DE PROMESA AUTORIZADO                        | 340 DÍAS |
| EL/LOS DA/DAÑOS DE LOS DÍAS CONTINÚE/CONTINÚEN *<br>EMPRESA: |          |

| Código del proyecto            |                          | MCD-00A-LC-01 |  |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|--|
| Periodo de análisis            | 08/04/2015 al 20/05/2015 |               |  |
| Monto original del contrato    | 0                        |               |  |
| Monto actualizado del contrato | 0                        |               |  |
| Fecha de elaboración           | mayo de 2015             |               |  |

**"CONTRALUCEO EDIFICIO DE LA DANZA, CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTUEZAR GUATEMALA, GUATEMALA"**

Tepic  
Javier  
Univ. de Coahuila  
Escuela de Ingenieria Comercial  
Fecha de Publicación

Ministerio de Cultura y Deportes  
MCD-064, 135-2321  
18 de mayo de 2023

[illegible]

*[Signature]*  
**ELDA CONSTRUCCIONES**  
**GERENCIA**  
*[Signature]*  
 San Jorge Roques  
 Guatemala.

*[Signature]*  
**Rony F. Sánchez Chaves**  
 INGENIERO CIVIL  
 Colegiado No. 3,631

ONY CHAVEZ RIVERA  
ARQUITECTO  
COLEGIADO 1021
























Elda  
Construcciones





10- Informe Fotográfico del Proyecto elaborado y firmado por la Empresa Contratista, autorizado por el Supervisor del Proyecto. Dicho Informe debe comprender el período de la Estimación correspondiente.

Construyendo el futuro




## 1.0206 - Trazo y corrimiento de niveles

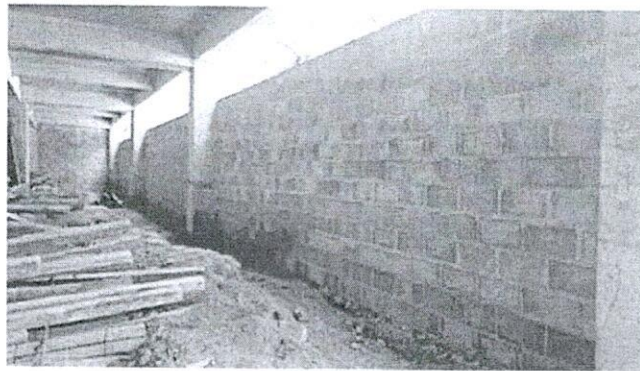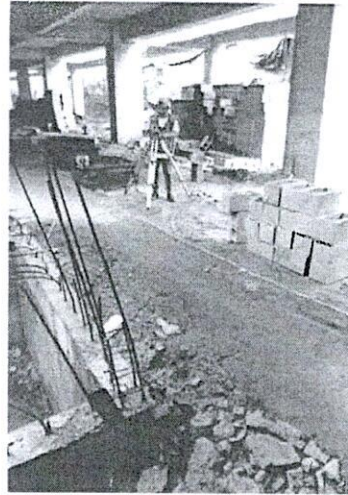

  
Rony F. Sánchez Chávez  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 3,631






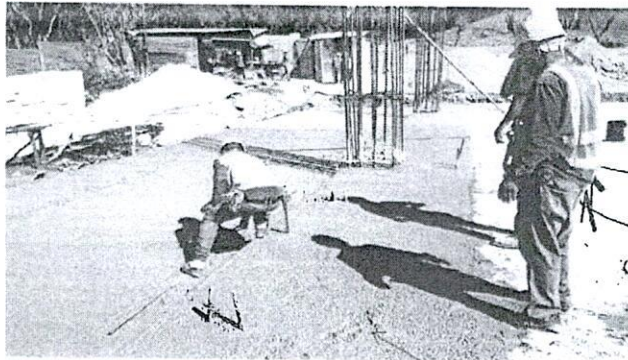

Fundición de losa

## 2.205 - Muro de Contencion en Voladizo de Concreto Armado

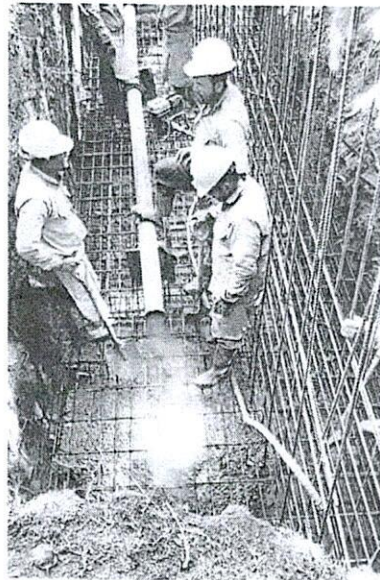

Fundición de muro

  
Sánchez Chávez  
INGENIERO CIVIL  
Colegiado No. 3,631







**INFORME ANALITICO # 06**

**Estimación de Trabajo No. 06**

2.0309 - Vigas y losa de entrepiso (losa 1, nivel 0.00):

Formaleta para losa

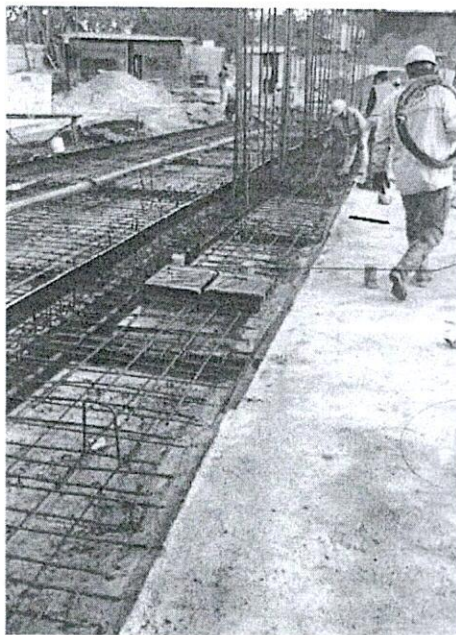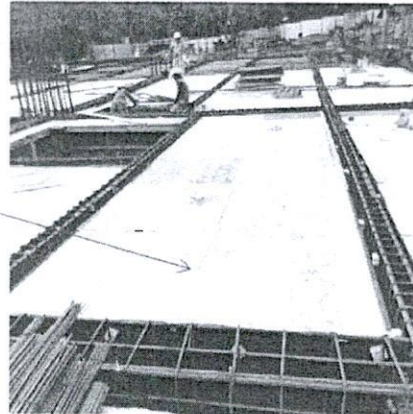

Armadura

*[Signature]*  
Javier Chávez  
INGENIERO CIVIL  
C. 3,631

