



Ministerio de **COPIA**
Cultura y Deportes



Guatemala, 3 de junio de 2025
Oficio No. DIPLAMI-413-2025/MAMC/amflm

Licenciada
Lucrecia Edith Martínez López
Directora Técnica de Presupuesto -DTP-
Ministerio de Finanzas Públicas

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

04 JUN 2025
Firma: [Firma] Hora: 15:17
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señora Directora:

Nimalaj rutzil wach alaq, kinwiye'j utzilal xuquje' tewchinik pa taq ri chak ronojel q'ij. (K'iche'). Es un placer dirigirme a usted con un saludo cordial, deseándole éxitos y bendiciones en sus labores diarias.

En cumplimiento al artículo 81. Ejecución física de inversión del Decreto 36-2024 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado" vigente para el Ejercicio Fiscal 2025, para lo cual se remite la Ejecución física de inversión del Ministerio de Cultura y Deportes correspondiente al mes de **mayo** 2025.

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente,

[Firma]
Lic. Marcos Fabricio Loarca Marroquín
Profesional II
Dirección de Planificación y
Modernización Institucional

[Firma]
Licda. Mariela Alejandra Marañón Contreras
Directora de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes
Vo.Bo.
SEGEPLAN
RECEPCION
05 JUN 2025
HORA: 9:44 NOMBRE: SMC

C.c. Lic. Carlos Mendoza Alvarado, Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Se adjuntan: _____ folios inclusive
Archivo DIPLAMI



Ministerio de
Cultura y Deportes



Guatemala, 03 de junio del 2025
OFICIO DPM/DGDR-211-2025


Licenciada

Mariela Alejandra Morataya

Directora de Planificación y Modernización Institucional

Ministerio de Cultura y Deportes

Su Despacho



HORA: 15:57 RESPONSABLE: Heidee

Licenciada Morataya:

De manera atenta me dirijo a usted, con el fin de trasladar el **Oficio DIF-YGG-2550-2025/jtm** en seguimiento de **Oficio DIF-PLANI-2539-2025/mr**, en relación al cumplimiento del comprobante de Ejecución de Metas de los Proyectos en Ejecución de la Dirección de Infraestructura Física, así mismo mediante **Oficio DIF-DSP-2538-2025/pc**, reportan los avances administrativos de los proyectos en mención de dicho oficio.

Derivado de lo anterior se adjunta **COMPROBANTES DE EJECUCION DE METAS POR PROGRAMA**, del mes de mayo de 2025.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente.

Sofia Annajael Díaz Alecio
Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes

C.c. Archivo



Ministerio de
Cultura y Deportes




OFICIO DIF-YGG-2550-2025/jtm
Guatemala, 03 de junio de 2025

Señora

Sofía Annajael Díaz Alecío

Delegada de Planificación y Modernización en Funciones
Dirección General del Deporte y la Recreación
Ministerio Cultura y Deportes
Presente



Estimada Señora Díaz:

Por este medio me dirijo a usted, en seguimiento al **OFICIO DIF-PLANI-2539-2025**, de fecha 02 de junio de 2025, suscrito por el Ingeniero Mauricio Leonel Ramírez Guzmán, Jefe de Planificación de Proyectos, quien remite comprobante de ejecución de metas del mes de mayo del presente año de los proyectos en ejecución de la Dirección de Infraestructura Física.

Así mismo, informa que mediante **OFICIO DIF-DSP-2538-2025/pc**, de fecha 02 de junio de 2025, emitido por el Departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó al Departamento de Planificación de Proyectos la realización de avances físicos de los siguientes proyectos:

- Construcción Cancha Polideportiva Colonia La Blanquita, La Blanca, San Marcos
- Construcción Cancha Polideportiva Caserío Las Morenas, La Blanca, San Marcos
- Construcción Cancha Polideportiva Centro Urbano, La Blanca, San Marcos

Así mismo se realizaron avances administrativos en los siguientes proyectos:

- Construcción Parque Deportivo y Recreativo Aldea Los Mixcos Palencia, Guatemala
- Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas Caserío Las Delicias, Ayutla, San Marcos
- Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas (Polideportivo), Aldea Los Bordos de Barrilas, El Jícaro, El Progreso.

Lo anterior, se traslada el **COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA** del mes de mayo de 2025.

Se adjunta cuadro firmado y sellado por mi persona y por el Director General del Deporte y la Recreación.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Yidja Giron Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

C.c DIF



Ministerio de
Cultura y Deportes



OFICIO DIF-PLANI-2539-2025/mr
Guatemala, 02 de junio de 2025.

Ingeniera
Yidja Girón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación



Estimada Ingeniera

Es grato para mi saludarla y al mismo tiempo trasladar el Comprobante de ejecución de metas del mes de febrero de los proyectos en ejecución de la Dirección de infraestructura Física.

Se informa que mediante oficio DIF-DSP-2538-2025/pc de fecha 02 de junio de 2025, emitido por el departamento de Supervisión de Proyectos, se notificó a este departamento que se realizaron avances físicos de los siguientes proyectos:

- Construcción Cancha Polideportiva Caserío Las Morenas, La Blanca, San Marcos
- Construcción Cancha Polideportiva Colonia La Blanquita, La Blanca, San Marcos
- Construcción Cancha Polideportiva Centro Urbano, La Blanca, San Marcos

Asi mismo se realizaron avances administrativos de los siguientes proyectos:

- CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS
- CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO

Debido a lo anterior se traslada el COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE METAS POR PROGRAMA del mes de abril de 2025.

Deferentemente

Ing. Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emisión : 02/06/2025
Hora emisión : 18:00:28
Página : 2 de 2

Periodo/Mes : mayo

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
Programa : CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		(Pr-Sp-Py) Estructura : 13-0-1	1,263.92
239667	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
244285	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERIO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	.00
278737	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
285300	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CENTRO URBANO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	.00
297782	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) PARAJE POGUART ZONA 3, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	.00
298222	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, CABAÑAS, ZACAPA	Metro cuadrado	.00
298794	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS PALENCIA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
299365	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JICARO, EL PROGRESO	Metro cuadrado	.00
300329	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO LA CANCHA, MORALES, IZABAL	Metro cuadrado	242.27
300364	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,ALDEA BUENA VISTA , CHINAUTLA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
301096	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	272.55
301097	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	304.30
301098	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ,CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	444.80
306712	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), CANTÓN NORTE, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00
316428	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ,LOTIFICACION MONTE DE LOS OLIVOS ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Metro cuadrado	.00
331164	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD), BARRIO ARRIBA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
334741	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), MARIO MENA, BARRIO BANANERA, MORALES, IZABAL	Metro cuadrado	.00
334748	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) BARRIO EL CAMPO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	.00
336815	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO) ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	.00

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA -SNIP-
Comprobante de ejecucion de Metas por Programa

Fecha emisión : 02/06/2025
Hora emisión : 18:00:28
Página : 1 de 2

Periodo/Mes : mayo

SNIP	Nombre	Unidad de Medida	Ejecutado
------	--------	------------------	-----------

Entidad : MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Unidad Ejecutora : DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y RECREACION

Programa	Estructura	Unidad /medida	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13- 0- 1	Metro cuadrado	1,263.92

Ing. Yidja Gifón Gutiérrez

Firma en calidad de Planificación
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Mario Alfonso Heredia de León

Firma y sello Autoridad maxima

Mgtr. Mario Alfonso Heredia de León
Director General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Ministerio de Cultura y Deportes



Ministerio de
Cultura y Deportes



OFICIO DIF-DSP-2538-2025/pc
Guatemala, 02 de junio de 2025

Ingeniero
Mauricio Leonel Ramírez Guzmán
Jefe de Planificación de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Presente

Estimado Ingeniero Ramírez

Reciba un cordial saludo esperando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

Por medio de la presente, me permito informar que se realizó el seguimiento respectivo a los siguientes proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-, del mes de mayo, esto con el fin de continuar con los trámites correspondientes. (se adjunta cuadro y justificaciones).

Sin otro particular, me suscribo de usted.



Ing. Rosa Aminta Girón Tellez
Jefe de Supervisión de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación

Vo.Bo.

Ing. Yajá Girón Gutiérrez
Director de Infraestructura Física
Dirección General del Deporte y la Recreación
Viceministerio del Deporte y la Recreación



**CUADRO DE PROYECTOS Y SU TIPO DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA -SINIP-.**

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SEGUIMIENTO
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA.	ADMINISTRATIVO
2	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO.	ADMINISTRATIVO
3	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS.	ADMINISTRATIVO
4	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS.	FÍSICO
5	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS.	FÍSICO
6	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS.	FÍSICO

JUSTIFICACIONES

"CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA"

- **Problema:** El proyecto se encuentra suspendido según acta de bitácora de obra No.23 de fecha 24 de septiembre de 2024, La municipalidad reporto que termino los trabajos que realizaba en los alrededores del proyecto, por lo cual solicitan la finalización de la suspensión, a lo cual la empresa solicita 15 días hábiles para coordinar logística de materiales, herramienta, equipo y personal.
- **Acciones:** Se tiene previsto levantar la suspensión el día 02 de junio del 2025.

"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (POLIDEPORTIVO), ALDEA LOS BORDOS DE BARILLAS, EL JÍCARO, EL PROGRESO".

- **Problema:** No se da avance físico, debido a que el tiempo del acta de conciliación se venció el 14/03/2025, derivado de lo anterior se continua con visitas, pero el avance de los trabajos es parcial por lo tanto no refleja un progreso significativo.
- **Acciones:** A espera de decisión si se continúa o no con el proyecto por parte de las autoridades.

"CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASERÍO LAS DELICIAS, AYUTLA, SAN MARCOS".

- **Problema:** Como nuevo supervisor no estoy de acuerdo con el avance reportado hasta el mes de abril, por lo que no se sube avance hasta que se pueda cumplir con el ultimo avance reportado, por lo tanto, no se da avance físico ya que durante las visitas de supervisión realizadas se observaron trabajos ejecutados con deficiencias que se deben mejorar.
- **Acciones:** Se indicó en bitácora los renglones que se deben mejorar.

"CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS"

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

"CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN MARCOS"

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.

"CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LAS MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS"

- Cuenta con avance físico, se adjunta informe de avances.



Ministerio de
Cultura y Deportes

“CONSTRUCCIÓN CANCHA
POLIDEPORTIVA, CENTRO URBANO, LA
BLANCA, SAN MARCOS”


INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE MAYO DE 2025

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CENTRO URBANO, LA BLANCA, SAN MARCOS	CÓDIGO DEL PROYECTO: D00R-SC-6-13-32-01	PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO: 120
EXEUTOR: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCOD)	CIOTACIÓN No: 301093	PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:
MANEJO DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: D00R-36-2024, D00R-03-2025	MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: Q 543,017.01	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO: 24
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 8 de mayo de 2023	MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO: Q	DÍAS DE PRORROGA AUTORIZADA:
FECHA DE FINALIZACIÓN: 01 de septiembre de 2025	FECHA DE ELABORACIÓN: 3 de junio de 2025	DÍAS CALIFICADOS POR ELIMINAR: 94
RESERVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	No. DE DOCUMENTO: 301094-03-05-2025	EMPRESA: CONSTRUCCIONA MERIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

No.	DESCRIPCION DEL ÍTEM	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CAMBIO		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTO ACUMULADO PERIODO ANTERIOR			MONTO DE ESTE PERIODO			MONTO ACUMULADO ACTUAL			MONTO PERIÓDICO DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.M.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES																						
1.01	Alfombras de liberación del proyecto	1.00	unidad	Q 2,535.00	Q 2,535.00					1.00	Q 2,535.00			0.00%	1.00	Q 2,535.00	100.00%	1.00	Q 2,535.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.02	Trazo y replanteo topográfico	600.00	m²	Q 18.50	Q 11,100.00					600.00	Q 11,100.00			0.00%	600.00	Q 11,100.00	100.00%	600.00	Q 11,100.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.03	Conformación de subrasante	600.00	m²	Q 41.66	Q 25,000.00					600.00	Q 25,000.00			0.00%	600.00	Q 25,000.00	100.00%	600.00	Q 25,000.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
1.04	Conformación de base	120.00	m²	Q 17.50	Q 2,100.00					120.00	Q 2,100.00			0.00%	120.00	Q 2,100.00	100.00%	120.00	Q 2,100.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.02	CANCHA POLIDEPORTIVA																						
2.01	Base de concreto, sustrato con electrodos	437.00	m²	Q 278.45	Q 121,681.15					437.00	Q 121,681.15			0.00%	437.00	Q 121,681.15	100.00%	437.00	Q 121,681.15	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.02	Base de concreto	130.00	m²	Q 183.82	Q 23,900.00					130.00	Q 23,900.00			0.00%	130.00	Q 23,900.00	100.00%	130.00	Q 23,900.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.03	Base para Pista de Voleibol	2.00	unidad	Q 41.43	Q 82.86					2.00	Q 82.86			0.00%	2.00	Q 82.86	100.00%	2.00	Q 82.86	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.04	Base para Pista de Fútbol	2.00	unidad	Q 134.56	Q 269.12					2.00	Q 269.12			0.00%	2.00	Q 269.12	100.00%	2.00	Q 269.12	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.05	Montado para Marco y Tackles	8.00	unidad	Q 451.39	Q 3,611.12					8.00	Q 3,611.12			0.00%	8.00	Q 3,611.12	100.00%	8.00	Q 3,611.12	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.06	Pista para soporte de Red de Voleibol	2.00	unidad	Q 465.00	Q 930.00					2.00	Q 930.00			0.00%	2.00	Q 930.00	100.00%	2.00	Q 930.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.07	Alfombras de soporte para Tackles de Base de Voleibol	2.00	unidad	Q 4,704.00	Q 9,408.00					2.00	Q 9,408.00			0.00%	2.00	Q 9,408.00	100.00%	2.00	Q 9,408.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.08	Alfombras de Base de Voleibol	2.00	unidad	Q 2,872.30	Q 5,744.60					2.00	Q 5,744.60			0.00%	2.00	Q 5,744.60	100.00%	2.00	Q 5,744.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.09	Pista de cancha polideportiva	291.50	m²	Q 130.00	Q 37,895.00					291.50	Q 37,895.00			0.00%	291.50	Q 37,895.00	100.00%	291.50	Q 37,895.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.10	Resaca	1.50	m²	Q 418.00	Q 627.00					1.50	Q 627.00			0.00%	1.50	Q 627.00	100.00%	1.50	Q 627.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.11	Alfombras Decoreadas	106.00	m²	Q 715.00	Q 75,790.00					106.00	Q 75,790.00			0.00%	106.00	Q 75,790.00	100.00%	106.00	Q 75,790.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.00	ALICATADO DE GRADILLO + ESTRUCTURA METÁLICA																						
3.01	Gradil de aluminio Tipo CC-1	89.00	m	Q 246.95	Q 21,989.55					89.00	Q 21,989.55			0.00%	89.00	Q 21,989.55	100.00%	89.00	Q 21,989.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.02	Gradil de aluminio Tipo S-1	144.00	m	Q 254.51	Q 36,649.56					144.00	Q 36,649.56			0.00%	144.00	Q 36,649.56	100.00%	144.00	Q 36,649.56	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.03	Gradil de aluminio Tipo S-2	49.00	m	Q 257.25	Q 12,585.25					49.00	Q 12,585.25			0.00%	49.00	Q 12,585.25	100.00%	49.00	Q 12,585.25	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.04	Gradil de aluminio Tipo S-3	17.00	m	Q 246.15	Q 4,184.55					17.00	Q 4,184.55			0.00%	17.00	Q 4,184.55	100.00%	17.00	Q 4,184.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.05	Base de Gradil	36.00	m²	Q 521.15	Q 18,761.40					36.00	Q 18,761.40			0.00%	36.00	Q 18,761.40	100.00%	36.00	Q 18,761.40	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.06	Alfombras de Base de Gradil a 0.15m x 0.15m, a 0.20m	47.44	m²	Q 243.75	Q 11,565.88					47.44	Q 11,565.88			0.00%	47.44	Q 11,565.88	100.00%	47.44	Q 11,565.88	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.07	Estructura de Gradil + alfombras de Base de Gradil	87.83	m²	Q 290.00	Q 25,469.50					87.83	Q 25,469.50			0.00%	87.83	Q 25,469.50	100.00%	87.83	Q 25,469.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.08	Gradil	96.00	unidad	Q 334.00	Q 32,064.00					96.00	Q 32,064.00			0.00%	96.00	Q 32,064.00	100.00%	96.00	Q 32,064.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.09	Gradil de acero	12.00	unidad	Q 243.13	Q 2,917.56					12.00	Q 2,917.56			0.00%	12.00	Q 2,917.56	100.00%	12.00	Q 2,917.56	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.10	Gradil de aluminio	9.00	m	Q 1,111.50	Q 10,003.50					9.00	Q 10,003.50			0.00%	9.00	Q 10,003.50	100.00%	9.00	Q 10,003.50	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.11	Gradil	65.24	m²	Q 14.38	Q 938.88					65.24	Q 938.88			0.00%	65.24	Q 938.88	100.00%	65.24	Q 938.88	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.12	Gradil	65.24	m²	Q 65.00	Q 4,240.60					65.24	Q 4,240.60			0.00%	65.24	Q 4,240.60	100.00%	65.24	Q 4,240.60	100.00%	0.00	Q -	0.00%
3.13	Gradil	65.24	m²	Q 91.00	Q 5,946.84					65.24	Q 5,946.84			0.00%	65.24	Q 5,946.84	100.00%	65.24	Q 5,946.84	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.00	GRADIL + ESTRUCTURA EN CANCHA																						
4.01	Gradil de aluminio	3.00	m	Q 226.45	Q 679.35					3.00	Q 679.35			0.00%	3.00	Q 679.35	100.00%	3.00	Q 679.35	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.02	Gradil de aluminio	3.00	m	Q 254.51	Q 763.53					3.00	Q 763.53			0.00%	3.00	Q 763.53	100.00%	3.00	Q 763.53	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.03	Gradil de aluminio	1.60	m	Q 163.00	Q 260.80					1.60	Q 260.80			0.00%	1.60	Q 260.80	100.00%	1.60	Q 260.80	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.04	Gradil de aluminio Tipo S-1	7.20	m	Q 253.13	Q 1,822.56					7.20	Q 1,822.56			0.00%	7.20	Q 1,822.56	100.00%	7.20	Q 1,822.56	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.05	Alfombras de Base de Gradil a 0.15m x 0.15m, a 0.20m	2.34	m²	Q 243.75	Q 570.38					2.34	Q 570.38			0.00%	2.34	Q 570.38	100.00%	2.34	Q 570.38	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.06	Base de Gradil	6.50	m²	Q 470.00	Q 3,055.00					6.50	Q 3,055.00			0.00%	6.50	Q 3,055.00	100.00%	6.50	Q 3,055.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.07	Base de Gradil	0.47	m²	Q 253.12	Q 119.38					0.47	Q 119.38			0.00%	0.47	Q 119.38	100.00%	0.47	Q 119.38	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.08	Puerto tipo Lateral	1.00	unidad	Q 811.70	Q 811.70					1.00	Q 811.70			0.00%	1.00	Q 811.70	100.00%	1.00	Q 811.70	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.09	Gradil	10.85	m²	Q 67.30	Q 730.62					10.85	Q 730.62			0.00%	10.85	Q 730.62	100.00%	10.85	Q 730.62	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.10	Gradil	10.85	m²	Q 65.00	Q 705.25					10.85	Q 705.25			0.00%	10.85	Q 705.25	100.00%	10.85	Q 705.25	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.11	Gradil	10.85	m²	Q 111.00	Q 1,203.75					10.85	Q 1,203.75			0.00%	10.85	Q 1,203.75	100.00%	10.85	Q 1,203.75	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.12	Alfombras de Base de Gradil	1.00	unidad	Q 2,602.00	Q 2,602.00					1.00	Q 2,602.00			0.00%	1.00	Q 2,602.00	100.00%	1.00	Q 2,602.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.13	Gradil de Base de Gradil	4.00	unidad	Q 298.00	Q 1,192.00					4.00	Q 1,192.00			0.00%	4.00	Q 1,192.00	100.00%	4.00	Q 1,192.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.14	Pista de Base de Gradil	4.00	unidad	Q 4,437.00	Q 17,748.00					4.00	Q 17,748.00			0.00%	4.00	Q 17,748.00	100.00%	4.00	Q 17,748.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.15	Luminarias	12.00	unidad	Q 871.00	Q 10,452.00					12.00	Q 10,452.00			0.00%	12.00	Q 10,452.00	100.00%	12.00	Q 10,452.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
4.16	Tubos de Base de Gradil	3.00	unidad	Q 1,546.00	Q 4,638.00					3.00	Q 4,638.00			0.00%	3.00	Q 4,638.00	100.00%	3.00	Q 4,638.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
TOTALES					Q 380,017.01						Q 380,017.01			0.00%		Q 380,017.01	100.00%		Q 380,017.01	100.00%		Q 380,017.01	100.00%

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO	Q	543,017.01
COSTO MODIFICADO DEL CONTRATO	Q	
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL (días calendario)		120
DÍAS PRORROGA ACTUALIZADOS		-
FECHA DE INICIO		
FECHA DE FINALIZACIÓN (SEGUN CONTRATO)		
AVANCE FÍSICO EJECUTADO		39.54%

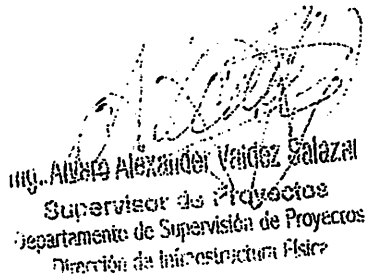

 My. Álvaro Alexander Váñez Salazar

 Supervisor de Proyectos

 Departamento de Supervisión de Proyectos

 Dirección de Infraestructura Física



Ministerio de
Cultura y Deportes

“CONSTRUCCIÓN CANCHA
POLIDEPORTIVA, COLONIA LA
BLANQUITA, LA BLANCA, SAN
MARCOS”

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE MAYO DE 2025

INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, COLONIA LA BLANQUITA, LA BLANCA, SAN LUCAS
CUENTA:	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES (MUCUD)
UNIDAD DE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES:	OC06-16-304
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	8 de mayo de 2025
FECHA DE REALIZACIÓN:	4 de septiembre de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	

CÓDIGO DEL PROYECTO:	OC06-SC-37-304
CUENTA:	301097
MONTOS ORIGINALES DE CONTRATO:	Q 421,472.56
MONTOS ACTUALIZADOS DE CONTRATO:	Q
FECHA DE ELABORACIÓN:	2 de junio de 2025
NÚM. DE DOCUMENTO:	361897-08-06-2025

PLAZO ORIGINAL EN DIAS CALENDARIO:	120
PLAZO ACTUALIZADO EN DIAS CALENDARIO:	-
PLAZO TRANSCURRIDO EN DIAS CALENDARIO:	24
DÍAS DE PERÍODO AUTORIZADO:	96
DÍAS CALIFICANDO POR ELIMINAR:	
EMPRESA:	CONSTRUCTORA MIZOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Ítem	DESCRIPCION DEL ÍTEM	CANTIDADES CONTRATADAS				ORDEN DE CALIDAD		TRABAJO SUPLEMENTARIO		CANTIDADES MODIFICADAS		MONTOS ACUMULADOS PERÍODO ANTERIOR			MONTOS DE ESTE PERÍODO			MONTOS ACUMULADOS ACTUAL			MONTOS PENDIENTES DE EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	P.V.	TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%	CANTIDAD	MONTOS	%
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES																						
2.01	Movimiento de tierra (excavación del proyecto)	1.00	unidad	Q 2,535.00	Q 2,535.00	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 2,535.00	Q -	Q -	0.00%	1.00	Q 2,535.00	100.00%	1.00	Q 2,535.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.02	Trazo y replanteo topográfico	0.00	m²	Q 11,700.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.03	Conformación de sub-base	0.00	m²	Q 27,300.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.04	Conformación de base	0.00	m²	Q 30,175.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.00	CANCHA POLIDEPORTIVA																						
2.01	Base de concreto, espesor 15 cm	421.50	m²	Q 275.85	Q 117,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	421.50	Q 117,000.00	Q -	Q -	0.00%	421.50	Q 117,000.00	100.00%	421.50	Q 117,000.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.02	Base para Pista de Velocidad	1.00	unidad	Q 11,700.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	0.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.03	Base para Pista de Velocidad	1.00	unidad	Q 11,700.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	0.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.04	Base para Pista de Velocidad	1.00	unidad	Q 11,700.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	0.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.05	Base para Pista de Velocidad	1.00	unidad	Q 11,700.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	0.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.06	Base para Pista de Velocidad	1.00	unidad	Q 11,700.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	0.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.07	Base para Pista de Velocidad	1.00	unidad	Q 11,700.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	0.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.08	Base para Pista de Velocidad	1.00	unidad	Q 11,700.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 11,700.00	Q -	Q -	0.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	1.00	Q 11,700.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.09	Base para cancha polideportiva	331.50	m²	Q 138.00	Q 45,807.00	Q -	Q -	Q -	Q -	331.50	Q 45,807.00	Q -	Q -	0.00%	331.50	Q 45,807.00	100.00%	331.50	Q 45,807.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.10	Base para cancha polideportiva	1.50	m²	Q 458.00	Q 687.00	Q -	Q -	Q -	Q -	1.50	Q 687.00	Q -	Q -	0.00%	1.50	Q 687.00	100.00%	1.50	Q 687.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.11	Adosado Decorativo	106.00	m²	Q 315.00	Q 33,390.00	Q -	Q -	Q -	Q -	106.00	Q 33,390.00	Q -	Q -	0.00%	106.00	Q 33,390.00	100.00%	106.00	Q 33,390.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.00	ESQUEMA DE GRADADO • ESTRUCTURA METÁLICA																						
2.01	Esquema centro Tipo C-1	0.00	m	Q 215.00	Q 17,177.55	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.02	Esquema Intermedio Tipo S-1	144.00	m	Q 275.00	Q 39,600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	144.00	Q 39,600.00	Q -	Q -	0.00%	144.00	Q 39,600.00	100.00%	144.00	Q 39,600.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.03	Esquema Metálico Tipo S-1	0.00	m	Q 275.00	Q 14,807.15	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.04	Columna Tipo C-1	57.60	m	Q 246.13	Q 14,199.76	Q -	Q -	Q -	Q -	57.60	Q 14,199.76	Q -	Q -	0.00%	57.60	Q 14,199.76	100.00%	57.60	Q 14,199.76	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.05	Base de Gravel	31.00	m²	Q 331.35	Q 10,271.95	Q -	Q -	Q -	Q -	31.00	Q 10,271.95	Q -	Q -	0.00%	31.00	Q 10,271.95	100.00%	31.00	Q 10,271.95	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.06	Levantamiento de Malla de 0.15m x 0.15m, a 0.30 m.	0.00	m²	Q 243.75	Q 11,663.50	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.07	Calcular Malla • cubre de Malla en superficie	0.00	m²	Q 330.00	Q 34,350.00	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.08	Base de concreto	96.00	unidad	Q 375.00	Q 35,910.00	Q -	Q -	Q -	Q -	96.00	Q 35,910.00	Q -	Q -	0.00%	96.00	Q 35,910.00	100.00%	96.00	Q 35,910.00	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.09	Gravel de espesor	11.00	unidad	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	11.00	Q 3,774.10	Q -	Q -	0.00%	11.00	Q 3,774.10	100.00%	11.00	Q 3,774.10	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.10	Pavimento	1.00	m	Q 1,111.55	Q 1,111.55	Q -	Q -	Q -	Q -	1.00	Q 1,111.55	Q -	Q -	0.00%	1.00	Q 1,111.55	100.00%	1.00	Q 1,111.55	100.00%	0.00	Q -	0.00%
2.11	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.12	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.13	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.14	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.15	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.16	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.17	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.18	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.19	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.20	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.21	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.22	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.23	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.24	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.25	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.26	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.27	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.28	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.29	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.30	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.31	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.32	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.33	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.34	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%	0.00	Q -	0.00%
2.35	Base de concreto	0.00	m²	Q 343.10	Q 3,774.10	Q -	Q -	Q -	Q -	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0								



Ministerio de
Cultura y Deportes

**“CONSTRUCCIÓN CANCHA
POLIDEPORTIVA, CASERIO, LAS
MORENAS, LA BLANCA, SAN MARCOS”**

**INFORME DE AVANCES A SEGEPLAN
AL 31 DE MAYO DE 2025**

