



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Página 1 de 2

Nombre del Contratista:	Miguel Emerenciano Acosta Zac.	CUI:	1595 25284 1703
Tipo de Servicio	Servicios Técnicos ☐ Servicios Profesionales ☒		

Número de Contrato:	029-1068-2026-MCD	Plazo de Contrato:	01 de julio al 31 de diciembre del 2026
Acuerdo Ministerial:	603-2026	Fecha del informe:	31/07/2026

Periodo del Informe:	Del:	Día (01)	Mes (07)	Año (2026)	Al:	Día (31)	Mes (07)	Año (2026)
		01	julio	2026		31	julio	2026

Objeto del Contrato

"El Contratista" se compromete a prestar sus SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL en el Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, con dedicación, diligencia, con arreglo a los principios de la ética y probidad, en la prestación de servicios y cumplimiento de las actividades que se describen a continuación, sin ser estas limitativas, sino únicamente enunciativas.

Actividades conforme al contrato

- Realizar Proyectos de conservación, de los bienes inmuebles ubicados insitu en el área arqueológica del Parque Nacional Tikal.
- Planificar propuestas de proyectos de conservación, restauración, documentación y mantenimiento de los Bienes Culturales inmuebles del Parque Nacional Tikal (PANAT).
- Actualizar el inventario de todos los Bienes Muebles del Parque Nacional Tikal.
- Coordinar y supervisar los trabajos de restauración del Edificio Arqueológico 5D-15.
- Organizar asesoría en logística y técnicamente a los proyectos de Investigación de arqueología del Patrimonio Cultural de bienes Inmuebles del Parque Nacional Tikal.
- Promover cursos de capacitación para la conservación y protección de los Bienes Culturales Inmuebles del PANAT.
- Traslado, almacenaje y conservación de material arqueológico producto de las Investigaciones.
- Realizar Todas aquellas actividades que mis Servicio Requieran
- . Otras actividades relacionadas con los servicios a prestar.

Resultados de la prestación del servicio conforme al contrato


- a) Corrida de niveles en el interior de la Cámara Sur a la altura de 0.95m tomados del piso estucado original. En la Cámara Sur del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. En los 4 muros de la Cámara. En el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
- b) Colocación de 3 hilos a la altura de 0.05m, para nivelar los hilos del piso original estucado para determinar la bajada del agua hacia los accesos de la Cámara Sur. En el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
- c) Aplicación de una capa de 0.002m de grosor para la separación del piso original estucado con tierra fina blanca caliza sin aglutinamiento. En el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
- d) Aplicación de piso de sacrificio para protección del piso estucado original, a nivel de 0.05m de grosor, con salientes del agua hacia los accesos en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste
- e) Preparación del material para aplicación del piso de sacrificio y resanes en el interior de la Cámara Sur del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

Destroncado y deshierbado en el Templo 5D-87 fachada principal Oeste y fachada posterior Este de la Gran Plaza de Mundo Perdido.

- g) Destroncado y deshierbado en la Gran Pirámide 5D-54 en la Gran Plaza de Mundo Perdido, parte central gradas Ceremoniales y extremo Sur de la pirámide.

Miguel Emerenciano Acosta Zac

Nombre completo del contratista

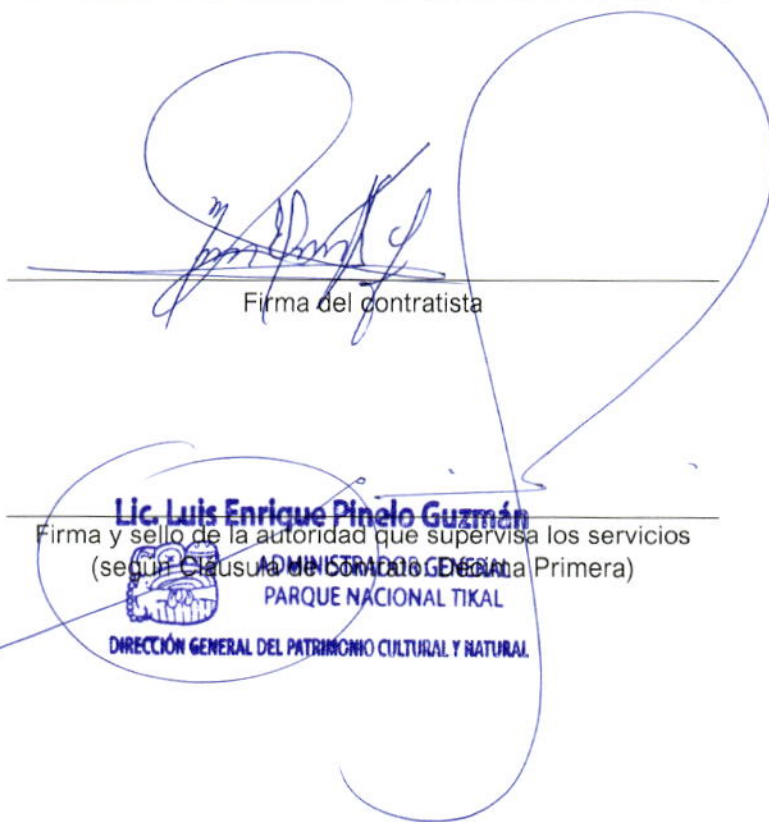

Firma del contratista

Lic. Luis Enrique Pinelo Guzmán

Nombre de la autoridad que supervisa los servicios
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)

Lic. Luis Enrique Pinelo Guzmán

Firma y sello de la autoridad que supervisa los servicios
(según Cláusula de contrato: Décima Primera)



ADMINISTRACIÓN GENERAL
PARQUE NACIONAL TIKAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
