

Raúl Eduardo Noriega Girón

RAÚL EDUARDO NORIEGA GIRÓN
01 Calle 3-23 zona 2, Santa Cruz del Quiché, Quiché
FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

noriegaer@yahoo.com

NIT.: 702165-8


Nº 00027
SERIE B

Día: 31 Mes: Octubre Año: 2013

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

Dirección: 12 av. 11-11 Zona 1

Nit.: 337851-9

Cantidad	Descripción	Valor
	Honorarios por servicios Técnico Profesionales en el Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Pichis y Pucallpa de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Octubre 2013 Según Contrato Administrativo No. 389-2013 y Acuerdo Ministerial No. 28-2013	
		Q. 10,000.00
		
	CANCELADO	
	NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL	
Total en letras:	Diez mil quinientos exactos	
<small>Impresiones Bermar Nit. 683671-2 - 100% act. Serie B del 01 al 100 Autorizado Según Resolución No. 2012-5-899-85 de Fecha 19-04-2012.</small>		Total Q. 10,000.00

Original, Cliente - Duplicado, Contabilidad

Guatemala, 31 de octubre 2013.
Informe 10-2013

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 389-2013**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **28-2013**, correspondiente **al mes de octubre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000027**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo y construcción de nueva letrina para uso del personal de apoyo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración del edificio A-5 en la Acrópolis oeste del sitio arqueológico Naranjo.
4. Supervisión de la producción de cal en la periferia del sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión en la restauración del cuarto nivel en el edificio B-15 en la Acrópolis Central del sitio arqueológico Naranjo.

Actividades emergentes

6. Supervisión en la restauración del edificio A-15 en el sitio arqueológico Naranjo.
7. Supervisión en la restauración del edificio A-7 en el sitio arqueológico Naranjo.
8. Supervisión en fundición de pisos en los servicios sanitarios destinados al uso turístico en el área arqueológica de Naranjo.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisaron los trabajos de limpieza en cocinas, dormitorios, baños y letrinas del campamento utilizado por el personal que labora en el sitio arqueológico Naranjo y se inició con la construcción de una nueva letrina para uso del personal de apoyo; el foso para la letrina se concluyó con una profundidad de profundidad de 3.00m.

2. Se supervisó el mantenimiento (limpieza y control de vegetación) en aproximadamente 8 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo, así como la limpieza permanente de los muros en los edificios ya restaurados.




Calzada a la acrópolis del Norte y esquina noroeste de Acrópolis Noreste

3. En el Edificio A-5 de la Acrópolis Oeste en el sitio arqueológico Naranjo se supervisó la restauración de 12 m² de restauración en el muro sur y esquina sureste además de re monticular parte del edificio en la fachada este, específicamente la superficie que adosada al muro recién restaurado, actividad hecha con la finalidad de manejar la escorrentía y evitar erosión sobre los muros.



Esquina sureste del edificio A-5

4. En la periferia al sitio arqueológico Naranjo se supervisó el armado y quema de piedra en el horno, el total de la producción fue de 26 toneles de cal en terrón equivalente a los 45 toneles de cal en pasta. En total se mantiene el fuego 72 horas continuas, trabajo realizado por 6 personas.

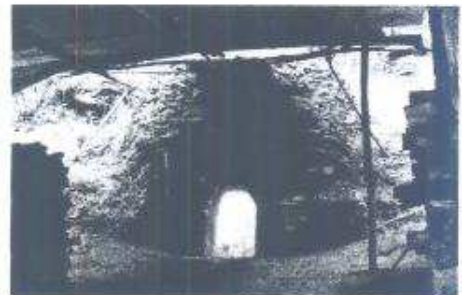

Proceso de quema de piedra para la producción de cal


5. En el cuarto nivel del edificio B-15 en la Acrópolis Central de Naranjo se supervisó la restauración de los muros del talud en el lateral norte de la escalinata y la fachada sur, el trabajaron



Esquina sur este del cuarto nivel iniciando con los trabajos de restauración

Actividades Emergentes

6. En el edificio A-15 del sitio arqueológico Naranjo se supervisó el trabajo de restauración en las fachadas norte y oeste, se trabajaron 28 metros cuadrados de muros en su mayoría núcleo del muro, para lo cual se utilizó piedra sin tallar recuperando volumen en el núcleo y sellando grietas.

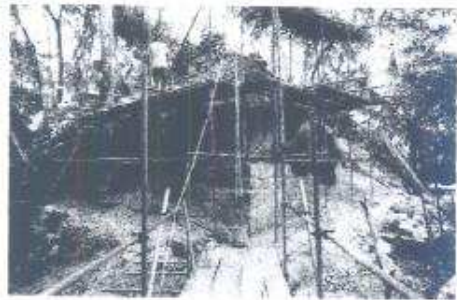

Esquina noroeste del edificio A-15

7. En el edificio A-7 de la Acrópolis Oeste se supervisó el trabajo de restauración realizado en 12 m² de muros, trabajos realizados en el muro interior norte del recinto en donde se estabilizaron muros mediante el resane de sisas y se desmontó los restos de muro adosado a la pared norte del recinto posiblemente un vano que posteriormente se armó utilizando mezcla hecha a base de cal.



Fachada sur del edificio A-7

8. Se supervisó la instalación de los artefactos sanitarios (dos retretes y dos lavamanos) en los servicios ubicados en el área arqueológica destinados para uso turístico. Con esta actividad se concluyó con la construcción de los sanitarios.



Sanitarios para visitantes en el área arqueológica

Elin Robel Hernández Payes
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
Instituto de Arqueología y Etnología DECORSIAP, Archivo.

Raúl Eduardo Noriega Girón
