

Guatemala, 31 de mayo 2019.
Informe 05-2019

Licenciada
Gladys Elizabeth Palala Gálvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado Licenciada Palala: /

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a los estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnicos Número 641-2019**, aprobado mediante **Acuerdo Ministerial Número 8-2019**, correspondiente al mes de mayo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie A3 número correlativo 0025**.

Actividades Realizadas:

1. Apoyo en el mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Apoyo en el mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Apoyo en la restauración del edificio B-24 en el sitio Arqueológico Naranjo.
4. Apoyo en la restauración del edificio B-18 en el sitio Arqueológico Naranjo.


Resultados Obtenidos:

1. Se hicieron trabajos de limpieza en toda la infraestructura existente en el campamento del MICUDE en el sitio arqueológico Naranjo.

2. Se hicieron trabajos de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 12 hectáreas en el área monumental del sitio arqueológico Naranjo, concentrando el esfuerzo en las áreas de la ciudad que son visitadas por el turismo local y extranjero. Con el trabajo realizado se resalta la volumetría del conjunto arquitectónico.




3. En el edificio B-24, en el sitio arqueológico Naranjo, en la esquina suroeste lado sur y oeste, se trabajó en la estabilización de 11 m² de sillares que dan forma a los relieves en el talud superior, para ello se resano sisas y se desmontó sillares originales colocándolos nuevamente unidos y se estabilizó el núcleo utilizando como aglutinante mezcla hecha a base de cal.

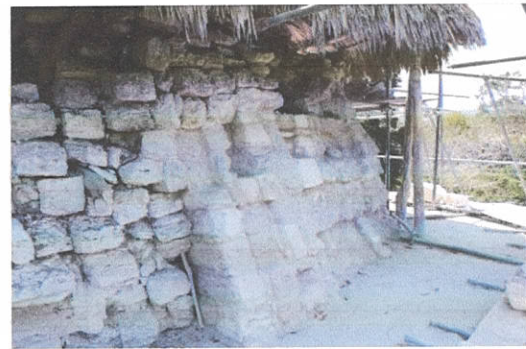

Además en la fachada oeste se trabajó en el desenraizado y la eliminación de un tronco de un árbol de la especie conocida como ramón y en la recuperación de volumen perdido en el núcleo de la pirámide, se trabajó una superficie de 35 m² del talud en el penúltimo cuerpo de la esquina noroeste lado oeste.



4. En el edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo, se trabajó en la estabilización de 45 m² de gradas y dos cuerpos en la fachada este del edificio, para ello fue necesario resanar sisas, desmontar sillares originales, se estabilizando el núcleo y se colocaron nuevamente los sillares originales utilizando mezcla hecha a base de cal como aglutinante.

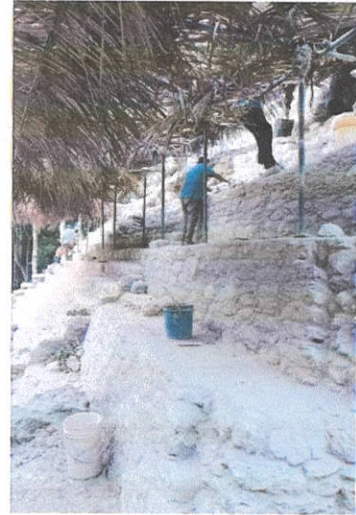

Raúl Eduardo Noriega Girón

Lic. Eán Hernández Payes M.Sc.
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGPCYN
